

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 2021000412 zo dňa 10.03.2021

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Košice**
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **SYTIQ a.s.**
so sídlom: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 52 286 843
DIČ: 2120967970
IČ DPH: SK2120967970
štatutárny orgán: Ing. Juraj Kotúč - predseda predstavenstva
Ing. Marek Žuffa - podpredseda predstavenstva
Mikuláš Čurik - člen predstavenstva
Ing. Zdenko Kuna - člen predstavenstva
Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddiele
Sa, vo vložke č. 6915/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

*uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 2021000412 zo dňa 10.03.2021 v znení dodatku č. 1 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), tento Dodatok č. 2 (ďalej len „**Dodatok**“):*

Článok 1

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa upravuje v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú Cenu

Diela uvedenú v bode 1 článku IV. Zmluvy o dielo o **32 664,32 € bez DPH, t.j. 39 197,18 € s DPH.**

3. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 1 článku IV. Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne:**

„1 Celková cena za kompletne vykonanie diela v rozsahu oceneného výkazu výmer je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.. Cenu diela je možné meniť len o písomné dohodnuté zmeny diela, a to na základe písomného dodatku podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami.

Cena diela bez DPH je: 1.601.654,42 €

(slovom: jeden milión šesťstojedentisícšesťstopäťdesiatštyri eura štyridsaťdva centov bez DPH)

DPH 20% 320.330,88 €

Cena celkom s DPH: 1.921.985,3 €

(slovom: jeden milión deväťstodvadsaťjedentisícdeväťstoosemdesiatpäť eur a tridsať centov s DPH)

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu bez DPH s upozornením na prenesenie daňovej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH."

4. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 1 článku III. Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne:**

„1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, za predpokladu, že Objednávateľ dodrží termín odovzdania staveniska a za predpokladu, že nenastanú iné okolnosti, s ktorými táto Zmluva spája zmenu termínu realizácie diela, zhotoviť a odovzdať dielo (aj „termín realizácie diela“) v čase:

- odovzdanie a prevzatie staveniska: najneskôr do 5 pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy na základe predchádzajúcej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na prevzatie staveniska,

- začatie prác na diele: najneskôr do 3 dní od prevzatia staveniska a odovzdania právoplatných stavebných povolení,

- zhotovenie a odovzdanie diela Objednávateľovi (lehota výstavby): do 30.09.2022.

Časový harmonogram vykonávania diela (ďalej aj „časový harmonogram" alebo „harmonogram"), tvorí prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ je oprávnený dielo zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi aj pred stanovenými termínmi. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne."

5. S ohľadom na úpravy v bode 4 tohto článku Dodatku sa pôvodná príloha č. 4 Zmluvy o dielo „harmonogram prác“ nahrádza novou prílohou „harmonogram prác“, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jej nasledovné prílohy :

1. Príloha č. 1 - Rekapitulácia zmenových listov + rozpočet

Zmenový list č. 8 Plynovodná prípojka a plynovod- revízia 01 Plyn

Zmenový list č. 10 Palisádový múr

Zmenový list č. 15 Elektroinštalácia - doplnenie revízie 01

Zmenový list č. 16 Doplnenie komína pre Lapač tukov a čerpacej stanice v splaškovej kanaľ.

Zmenový list č. 17 Dlažby a obklady zámeny

Zmenový list č. 18 Zosilnenie žb trámu lamelou

Zmenový list č. 19 VZT zmena zariadení 12.2 na 2NP a 3NP

Zmenový list č. 20 Stavebné prestupy pre ZTI a UK pre komín

2. Príloha č. 2 - harmonogram prác

V Košiciach dňa

V Bratislave, dňa 1.3.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Mesto Košice


Ing. Jaroslav Polaček

primátor

SYTIQ a.s.

Ing. Marek Žuffa

podpredseda predstavenstva



SYTIQ a. s.
Ing. Michal Bedaj
člen predstavenstva

Rekapitulácia

Zmeny - Rekapitulácia zmenových listov, dodatok 2

Stavba: Výstavba centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice -Krásna

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum: 18.01.2022

ZL č.	Obsah	Suma na ZL	Plusy	Minusy
8	Plynovodná prípojka a plynovod- revízia 01 Plyn	6 105,71 €	6 199,31	-93,60
10	Palisádový múr	6 173,73 €	6 500,13	-326,40
15	Elektroinštalácia - doplnenie revízie 01	9 398,55 €	9 436,50	-37,95
16	Doplnenie komína pre Lapač tukov a čerpacej stanice v splaškovej kanal.	664,24 €	664,24	0,00
17	Dlažby a obklady zámeny	7 150,96 €	13 936,04	-6 785,08
18	Zosilnenie žb trámu lamelou	863,52 €	863,52	0,00
19	VZT zmena zariadení 12.2 na 2NP a 3NP	1 307,24 €	1 996,01	-688,77
20	Stavebné pretupy pre ZTI a UK pre komín	1 000,37 €	1 000,37	0,00
21	Dvere požiarne - nie je predmetom dodatku č. 2	0,00 €	0,00	0,00
22	Revízia ELI 01 - nie je predmetom dodatku č. 2	0,00 €	0,00	0,00

SPOLU bez DPH

32 664,32 €

40 596,12 €

-7 931,80 €

DPH 20%

6 532,86 €

SPOLU s DPH

39 197,18 €

ZMENOVY LIST č. 8
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00691135 DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zast.:
Zhotoviteľ: IČO: 52286843 IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár: SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Projekt: , _ Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č: 8	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Plynovodná prípojka a plynovod- revízia 01 Plyn		
Požadovaný termín dokončenia zmeny: 15.5.2022		
Zmena zapríčinená:	x Projektom	Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Zmena projektu plynovodnej prípojky z dôvodu zmeny rozvodov pripojenia dodávateľom plynu SPP

Dohodnutá cena zmeny: 6 105,71 € bez DPH

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): termín ukončenia Plynovodnej prípojky je 15.05.2022

Prílohy: rozpočet prác naviac: SO06_Plynovodná prípojka a plynovod - revízia projektu č.1		
Dopady na termíny výstavby a iné: má dopad na konečný termín výstavby		
Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		19.1.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		19.1.2022
Súhlas Stavebný dozor:		19.1.2022
Súhlas Projektant:		19.1.2022
Distribúcia originálov: [x j] Počet originálov: 4 objednávatel		
EUEUEU Zhotoviteľ Technický dozor Projektant		
☐		

ZMENOVÝ LIST č. 10
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00691135 DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zast.:
Zhotoviteľ: IČO: 52286843 IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Projekt: , Výstavba censta komunlných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č. 10	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Palisádový múr		
Požadovaný termín dokončenia zmeny: 15.8.2021		
Zmena zapríčinená: x Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa		

Podrobný popis zmeny:

Zmena je vyvolaná z dôvodu výškových rozdielov terénu . Zmena obsahuje aj odpočet nerealizovaného pôvodného riešenia osadenie a dodávku chodníkových obrubníkov.

Dohodnutá cena zmeny: 6 173,73 € bez DPH

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Prílohy: rozpočet prác naviac: SO08 Palisádový múr			
Dopady na termíny výstavby a iné: má dopad na konečný termín výstavby			
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			19.1.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			19.1.2022
Súhlas Stavebný dozor:			19.1.2022
Súhlas Projektant:			19.1.2022
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 15
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:		IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár		Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
		zast.:	
Zhotoviteľ:		IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár		SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt: Výstavba cesty komunálnych sociálnych služieb MČ Košice - Krásna			
Dátum:	Zmenový list č: 15		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Elektroinštalácia - doplnenie revízie 01			
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----			
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☒ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny: zmena vyvolaná na základe doplnenia k revízii 01			
Dohodnutá cena zmeny: 9 398,55 € bez DPH			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: rozpočet prác navyše: SO 11 - Splašková kanalizácia - doplnenie komína pre LT a ČS			
Dopady na termíny výstavby a iné: má dopad na termín v harmonograme			
		Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
		Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			19.1.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			19.1.2022
Súhlas Stavebný dozor:			19.1.2022
Súhlas Projektant:			19.1.2022
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐			
Počet originálov: 4			

ZMENOVÝ LIST č. 16
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení
zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.
Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00691135

DIČ:

Názov. Sídlo, štatutár Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

zast.:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843

IČ DPH: SK2120967970

Názov. Sídlo, štatutár SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Projekt Výstavba cesty komunálnych sociálnych služieb MČ Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č: 16	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Doplnenie komína pre Lapač tukov a čerpacej stanice v splaškovej kanál.		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: x Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa		

Podrobný popis zmeny:

zmeny vyvolaná výškovými rozdielmi terénu, pri osadení lapaču tukov a čerpacej stanice bude potrebné doplniť skruže na každý
komínový vstup pre lapač tukov aj pre čerpaciu stanicu z dôvodu prekonania výškového rozdielu

Dohodnutá cena zmeny: 664,24 € bez DPH

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Prílohy: rozpočet prác navyše: SO 11 Spalňovacia kanalizácia - doplnenie komína pre LT a ČS			
Dopady na termíny výstavby a iné: nemá dopad na termín			
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			19.1.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			19.1.2022
Súhlas Stavebný dozor:			19.1.2022
Súhlas Projektant:			19.1.2022
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 17
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: 100:00691135

DIČ:

Názov, Šídlo, štatutár Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

zast.:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843

IČ DPH: SK2120967970

Názov. Šídlo, štatutár SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Projekt: , Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č: 17	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Dlažby a obklady zámeny		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: Projektom Realizáciou x Zmenou Objednávateľa		

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny: 7 150,96 € bez DPH

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Prílohy: rozpočet prác naviac: SO 01. _01 -ASR - Dlažby a obklady		
Dopady na termíny výstavby a iné: nemá dopad na termín		
Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		19.1.2022

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: 19.1.2022

Súhlas Stavebný dozor: 19.1.2022

Súhlas Projektant:	19.1.2022
Distribúcia originálov:	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
Počet originálov: 4	/Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant

ZMENOVÝ LIST č. 18

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: 100:00691135

DIČ:

Názov, Sídlo, štatutár Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

zast.:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843

IČ DPH: SK2120967970

Názov, Šídlo, štatutár SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava • mestská časť Ružinov

Projekt: , Výstavba cesty komunitných sociálnych služieb MC Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č: 18	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Zosilnenie žb trámu lamelou		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: x Projektom [Realizáciou Zmenou Objednávateľa		

Podrobný popis zmeny:

zmena bola vyvolaná z dôvodu potreby posilnenia trámu nad schodiskovou konštrukciou

Dohodnutá cena zmeny: 863,52 € bez DPH

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Prílohy: rozpočet prác naviac: SO 01_01 -ASR - Zosilnenie žb trámu lamelou			
Dopady na termíny výstavby a iné: nemá dopad na termín			
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			19.1.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			19.1.2022
Súhlas Stavebný dozor:			19.1.2022
Súhlas Projektant:			19.1.2022
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐			
Počet originálov: 4			

ZMENOVÝ LIST č. 19
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00691135

DIČ:

Názov, sídlo, štatutár Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

zast.:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843

IČ DPH: SK2120967970

Názov, sídlo, štatutár SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Projekt: ,, , Výstavba censta komumtrných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č.: 19	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: VZT zmena zariadení 12.2 na 2NP a 3NP		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: x Projektom [Realizáciou Zmenou Objednávateľa		

Podrobný popis zmeny:

Priestorové riešenie si vyžaduje rozmerovú zmenu zariadení v miestnostiach 2.21 a 2.24 a zmenu dvoch kusov zariadení 12.02 v m.,č. 2.01 a 3.04

Dohodnutá cena zmeny: 1 307,24 € bez DPH

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): žiadne

Prílohy: rozpočet prác naviac: SO 02_04_ VZT - zmena zariadení 12.2 na 2.NP a 3.NP			
Dopady na termíny výstavby a iné: nemá dopad na termín			
	Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			19.1.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			19.1.2022
Súhlas Stavebný dozor:			19.1.2022
Súhlas Projektant:			19.1.2022
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐			
Počet originálov: 4			

ZMENOVÝ LIST č. 20

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO00691135

DIČ:

Názov, Sídlo, štatutár Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

zast.:

Zhotoviteľ: IČO: 52286843

IČ DPH: SK2120967970

Názov, Sídlo, štatutár SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Projekt: ... , Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna		
Dátum:	Zmenový list č: 19	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Stavebné pretupy pre ZTI a UK pre komín		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: x Projektom Realizáciou x Zmenou Objednávateľa		

Podrobný popis zmeny:

zmena vyvolaná z dôvodu neexistujúceho prestupu cez stropnú konštrukciu a z dôvodu zmeny a posunu priestorového usporiadania je potrebné vytvoriť nové prestupy pre komínovú konštrukciu a zväčšenie prestupov pre potrubie prechádzajúce cez stropy. Z dôvodu zmeny šírky dverí vzniknú zmeny šírky otvorov , čo vyvolá práce navyiac pri - sekacie práce.

Dohodnutá cena zmeny: 1 000,37 € bez DPH

Dohodnuté podmienky zmeny {Termíny, splatnosti, iné ..}: žiadne

Prílohy: rozpočet prác navyiac: SO 06_02_prestupy stavebné			
Dopady na termíny výstavby a iné: nemá dopad na termín			
Odlažok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			19.1.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			19.1.2022
Súhlas Stavebný dozor:			19.1.2022
Súhlas Projektant:			19.1.2022
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: S_06_02
Stavba: Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Košice

Zhotoviteľ:
SYTIQ a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			32 664,32
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20.00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	32 664,32	6 532,86

Cena s DPH	v	EUR	39 197,18
------------	---	-----	-----------

Projektant

Dátum a podpis;

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	S 06 02		
Stavba:	Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna		
Miesto:		Dátum:	18.1.2022
Objednávateľ:	Mesto Košice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SYTIQ a.s.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		32 664,32	39 197,18
08	SO 06 - Plynovodná prípojka a plynovod revízia 01	6 105,71	7 326,85
10	SO 08 - Palisádový múr	6 173,73	7 408,48
15	SO01_07 - Elektroinštalácia_doplnenie_revízie 01	9 398,55	11 278,26
16	SO 11 -Splašková kanalizácia - doplnenie komína ore LT a ČS	664,24	797,09
17	SO01_01 -ASR- Dlažby a obklady	7 150,96	8 581,15
18	SO01_01 - ASR - Zosilnenie trámu lamelou	863,52	1 036,22
19	S002_04_VZT -Zmena zariadení 12.2 na 2NP a 3NP	1 307,24	1 568,69
20	SO01_01 - ASR - prestupy stavebné	1 000,37	1 200,44

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

08 - SO 06 - Plynovodná prípojka a plynovod _revízia 01

Miesto:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SÝTI Q a.s.

Spracovateľ:

PČ Typ Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
------------	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **6 105,71**

o D1 Elektroinštalácia 1 080,72

o D10 Bleskozvod 768,33

1	M	Pol440	Pásovina FeZn 4x30mm (1kg/1,06m)	kg	30,000	3,79	113,70
2	K	Pol448	Montáž Pásovina FeZn 4x30mm (1kg/1,06m)	m	31,800	2,63	83,63
3	M	Pol441	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	3,62	7,24
4	M	354410000500. S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia označenie SR 02	ks	12,000	4,25	51,00
5	M	01	Svorka pre kruhové vodiče do 25mm ²	ks	6,000	1,59	9,54
6	M	247710003500. S	Páska sťahovacia 1xš 200x2,5 mm	ks	2,000	0,10	0,20
7	M	354410024825. S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn kJP a 08, d 330 mm	ks	1,000	15,00	15,00
8	M	Pol379	Chránička ohybná FX25	m	1,000	2,30	2,30
9	K	220111728.S	Vodič zvodový z FeZn drôtu 10 mm, montáž do podpier	m	25,760	14,67	377,90
10	M	Pol439	Vodič FeZn fi 10mm - (1kg/1,61m)	kg	16,000	3,44	55,04
11	M	Pol436	Svorka pripojovacia - SS	ks	2,000	0,79	1,58
12	K	Pol452	Montáž Svorka pripojovacia - SS	ks	2,000	3,10	6,20
13	M	Pol442	Podpera pre uzemňovaciu pásku PP	ks	12,000	0,94	11,28
14	K	Pol450	Montáž Podpera pre uzemňovaciu pásku PP	ks	12,000	2,81	33,72

o D11 Ostatné 312,39

15	M	Pol76.1	Vodič H07-VK - 6mm zž	m	60,000	1,50	90,00
16	K	pol	Montáž Vodič H07-VK - 6mm zž a 16mm	m	110,000	0,60	66,00
17	M	02	Pripojnica potenc. vyrovnania pre montáž na omietku	ks	1,000	52,39	52,39
18	M	341110011600.S	Vodič medený CY 16 mm ²	m	50,000	2,08	104,00

o HSV Práce a dodávky HSV 2 880,96

o 1 Zemné práce 320,13

19	K	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m ³	m ³	20,000	6,32	126,40
20	K	123202109	Priplatok k cenám za lepivosť výkopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m ³	20,000	0,53	10,60
21	M	581530000400	Piesok zásypový	t	9,600	13,28	127,49
22	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	14,000	2,14	29,96
23	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	6,000	4,28	25,68

o 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 2 560,83

24	K	723130254.S	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 50	m	2,000	42,20	84,40
25	K	7231R	Dodávka a montáž HDPE chráničky D 110	m	39,000	59,01	2 301,39
w			ochranné rúrky				
w			24		24,000		
w			chránička pod komunikáciou				
w			15		15,000		
w			Súčet		39,000		
53	M	MAT001	Tesniaca manžeta D110/D63	ks	2,000	50,69	101,38
54	K	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	15,00	15,00
55	M	5534D0101	Poklop ventilový STN13 6582.10, Y4510 - 84 45 00	ks	1,000	35,04	35,04
56	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku	ks	1,000	17,73	17,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	2861F0303	Potrúbie plynové z PE - 100, vonk.priem. 32 mm -11 03 PPk	m	1,200	4,91	5,89

D
M

Práce a dodávky M

1 644,03

D		21-M	Elektromontáže	552,54			
26	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT1	m	6,500	17,94	116,61
27	M	354410055500. S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT1 m	ks	2,000	11,71	23,42
28	M	354410055700. S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m	ks	3,000	21,91	65,73
29	K	210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	1,000	15,22	15,22
30	K	210222204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením zúžená 3000, pre vonkajšie práce	ks	1,000	9,26	9,26
31	M	35441002770R	Tyč zachytávacia zúžrná	ks	1,000	306,30	306,30
32	M	EBL000001114	Hrotzatíkcaci 620001 20mm FeZn	ks	1,000	16,00	16,00

D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	114,66			
33	K	220321421	Montáž pripevnenie vodiča	ks	42,000	0,79	33,18
34	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí d63	m	42,000	1,94	81,48

D		23-M	Montáže potrubia	976,83			
35	K	230202103	Montáž plyn. prípojk z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami,dĺžka prípojky do 30 m. D 40 mm	m	-40,000	1,29	-51,60
36	M	2861673400	potrubie PE 100 SDR 11 d40	m	-40,000	1,05	-42,00
37	K	230200011	Montáž plynovodov do d63	m	94,000	2,74	257,56
38	M	286130036200.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m	m	94,000	5,10	479,40
39	M	286220031300.S	Prechodka PE/ocel' P E 100 SDR 11 D/DN 63/50	ks	1,000	28,11	28,11
40	K	230203006.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	8,61	8,61
41	M	286530187200.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	14,03	14,03
42	M	286530183100. S	Presuvná objímka predĺžená, elektrotvarovka FRIALONG PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	21,02	21,02
43	K	230203185.S	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	12,33	12,33
44	K	230203565.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 63/DN50 mm	ks	1,000	13,95	13,95
45	K	230210003	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studená - 2 vrstvy	m2	1,000	3,64	3,64
46	M	247710009500	Páska izolačná vrchná 2 vrstvá DENSOLEN R 30 HT š. 50 mm, dl. 30 m, s PE fóliou a butylkaučukovým poťahom na jednej strane, FRIALEN	ks	2,000	55,00	110,00
47	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	54,000	2,07	111,78
48	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	10,00	10,00

D
VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

500,00

51	K	001000031	Inžinierska činnosť - revízie úradné tlakové skúšky odovzdanie kompletnej dokumentácie, porealizačné zameranie	hod	1,000	300,00	300,00
52	K	001000034	dopravné náklady	eur	1,000	200,00	200,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

10 - SO 08 - Palisádový múr

Miesto:

Dátum: 18.1.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 173,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 173,73

D 01

Zameranie stavby - oprávneným geodetom

291,72

1	K	pc_geodet	Porealizačné zameranie a zakreslenie	kpl	1,000	291,72	291,72
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------

D 1

Zemné práce

960,55

2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,360	30,12	462,64
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

W "riha pre palisady
W 32*0,6*0,8
W Súčet

15,360
15,360

3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,680	8,52	65,43
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

W "50% lepivosť
W 15,36*0,5
W Súčet

7,680
7,680

4	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,360	5,51	84,63
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

W 15,36
W Súčet

15,360
15,360

5	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	107,520	0,51	54,84
---	---	-------------	---	----	---------	------	-------

W "7 km do vzdialenosti 10 km
W 15,36*7
W Súčet

107,520
107,520

6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,360	0,52	7,99
---	---	-------------	--	----	--------	------	------

W "hĺbenie rýhy
W 15,36
W Súčet

15,360
15,360

7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,184	4,25	124,03
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

W 15,36*1,9
W Súčet

29,184
29,184

8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,320	2,14	52,04
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

W "zásyp štrkopieskom základu
W 32*0,1*0,8*2
W "zásyp zeminou za palisádami
W 0,6*32
W Súčet

5,120
19,200
24,320

9	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	9,728	11,20	108,95
---	---	----------------	-----------------------------	---	-------	-------	--------

W 5,12*1,9
W Súčet

9,728
9,728

D 2

Zakladanie

1 509,47

10	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	32,623	46,27	1 509,47
----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

W "základ pod palisády
W 1,01*32,30
W Súčet

32,623
32,623

D 5

Komunikácie

65,28

11	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	16,000	4,08	65,28
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

W "podklad pod palisády
W 32*0,5
W Súčet

16,000
16,000

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

82,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	627452145.S	Škárovanie maltou MC zvislé aj vodorovné, medzi prefabrikovanými dielcami	m	135,100	0,61	82,41
	W		"škáry palisád				
	W		193*0,7		135,100		
	W		Súčet		135,100		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 124,56
13	K	917831514.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - do radu	m	32,000	17,28	552,96
	W		"dĺžka úsek palisád				
	W		32		32,000		
	W		Súčet		32,000		
14	M	AP16S90	PALISADA hranatá 28x14x90 cm SIVA (18ks/paleta)	ks	126,000	23,00	2 898,00
15	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-32,000	3,94	-126,08
16	M	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	-32,000	6,26	-200,32
D	99		Presun hmôt HSV				139,74
17	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	104,286	1,34	139,74

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

15 - SO01_07 - Elektroinštalácia_doplnenie_revizie 01

Miesto:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 398,55

D D1 Elektroinštalácia

9 398,55

D D10 Bleskozvod

-37,95

26	M	Pol434	AL/Mg/Si - drôt 08mm - (1kg/7,40m)	kg	-11,000	3,45	-37,95
----	---	--------	------------------------------------	----	---------	------	--------

D D11 Ostatné

6 963,55

1	M	Pol79.1	Vodič H07-VK - 4mm zž	m	300,000	0,27	81,00
2	M	Pol80.2	Kábel HWI	bm	85,000	51,63	4 388,55
3	M	pol81.2	Príchytka pre vodič HWI	ks	30,000	2,90	87,00
4	M	pol81.3	Pripojovacie príslušenstvo 2x (zvodí - začiatok, koniec)	ks	6,000	246,00	1 476,00
5	K	pol0001	Montáž Vodič H07-VK - 4mm zž	m	300,000	1,12	336,00
6	K	pol0002	Montáž kábel HWI	m	85,000	7,00	595,00

D D4 Svetelný obvod

1 606,30

7	M	Pol280x	Svietidlo D trubcové závesné 37W, NV, IP65	ks	8,000	55,85	446,80
8	M	Pol281x	Závesné lanko 1,5m nastaviteľné	ks	32,000	9,60	307,20
9	M	Pol68.1	Chránička ohybná vonkajšia 20mm	m	20,000	1,42	28,40
10	M	Pol289x	Úchytové príslušenstvo (klipy, hmoždinky, skrutky)	set	1,000	100,00	100,00
11	K	Pol280y	Montáž Svetidlo Meba	ks	11,000	27,50	302,50
12	K	Pol357	Montáž elektroinštalčnej rúrky	m	20,000	1,07	21,40
13	K	Pol326	Sekacie práce	hod	40,000	10,00	400,00

D D5 Zásuvkový obvod

866,65

14	M	Pol377	Zásuvka 2P+T	ks	40,000	3,05	122,00
15	M	Pol303	Zásuvka 2P+T IP44	ks	11,000	12,34	135,74
16	M	Pol356	Va rámček Bi 1U biela	ks	28,000	0,65	18,20
17	M	Pol306	Va rámček Bi 4U biela	ks	6,000	3,79	22,74
18	M	Pol288	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ks	55,000	0,14	7,70
19	M	Pol358	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	ks	10,000	0,58	5,80
20	K	Pol326	Sekacie práce	hod	15,000	10,00	150,00
21	K	Pol331	Murárske vysprávky	hod	10,000	10,00	100,00
22	K	Pol332	Pomocné elektromontážne práce	hod	20,000	5,00	100,00
23	K	Pol361	Montáž a osadenie elektroinštalčnej krabice	ks	65,000	0,14	9,10
24	K	Pol362	Montáž a osadenie elektroinštalčnej krabice KPR 68	ks	10,000	2,35	23,50
25	K	Pol380	Montáž zásuvka 1f 2P+T	ks	51,000	3,37	171,87

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

16 - SO 11 -Splašková kanalizácia - doplnenie komína pre LT a ČS

Miesto:

Dátum: 18.1.2022

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 664,24

o HSV Práce a dodávky HSV 664,24

D 8		Rúrové vedenie					647,87
4	K	894118001.S	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	3,125	63,39	198,09
W montáž komína pre lapač tuku W (1,0+0,25+0,625)70,6 3,125							
1	M	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/100-S s poplastovanou stúpačkou	ks	1,000	80,78	80,78
2	M	592247150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250 - S s poplastovanou stúpačkou	ks	1,000	38,02	38,02
3	M	592470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625- S s poplastovanou stúpačkou	ks	1,000	100,27	100,27
5	K	894118001.S	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	1,458	63,39	92,42
w montáž komína pre lapač tuku W (0,25+0,625)70,6 1,458							
7	M	592247150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250 - S s poplastovanou stúpačkou	ks	1,000	38,02	38,02
8	M	592470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625- S s poplastovanou stúpačkou	ks	1,000	100,27	100,27
D 99 Presun hmôt HSV 16,37							
9	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,650	2,14	16,37

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

17 - SO01_01 -ASR- Dlažby a obklady

Miesto:

Dátum: 18.1.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 150,96

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 150,96

D 771

Podlahy z dlaždíc

6 260,41

1	M	5976498320	Dlaždice keramické 300x300	m2	-84,263	10,00	-842,63
2	M	5978650320	Ker. dlaždice, rozmer 297x297x8 mm,	m2	-705,000	7,80	-5 499,00
3	M	PILU36NA	Dlažba 31x62cm natural mat chodba + kuchyňa	m2	735,000	12,91	9 488,85
4	M	PILU36NA_02	Dlažba 31x62cm natural nat -schodisko	m2	84,263	12,91	1 087,84
9	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany (dl. 1,7 m/ hrana)	m	129,200	1,22	157,62
10	M	2575	Schodový profil hranatý 10mm AL 2,5m (cena za ks) 2174	ks	80,000	9,95	796,00
VV		72,7272727272727*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva			80,000		
5	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	61,883	13,30	823,04
6	M	5978650320	Ker. dlaždice, rozmer 297x297x8 mm,	m2	31,883	7,80	248,69

D 781

Dokončovacie práce a obklady

890,55

7	M	5976498050	Dlaždice keramické - 300x300	m2	-37,265	11,90	-443,45
8	M	SIKOOE75364	Dekor 20x40 cm béžovohnedá mat Obklad - kúpelne a wc	ks	460,000	2,90	1 334,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

18 - SO01_01 - ASR - Zosilnenie trámu lamelou

Miesto:

Dátum: 18.1.2022

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

863,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

863,52

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

863,52

1	K	001R	Realizácia kotviacej drážky	m	3,600	60,00	216,00
2	K	93199416R	Zosilovanie nosnej konštrukcie trámu lamelou sikacarbodur	m	3,600	79,91	287,68
3	M	5714	Sikacarbodur® S1012 lamela	m	4,000	44,50	178,00
4	M	564325	Sikadur 31 CF Rapid	kg	6,000	15,90	95,40
5	K	002R	Dopravné náklady	m	3,600	24,01	86,44

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

19 - S002 04 VZT - Zmena zariadení 12.2 na 2NP a 3NP

Miesto:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 307,24

▫ D2 - prívod a odvod vzduchu

0,00

▫ D3 D3

586,11

8	K	Pol200	Stenový ventilátor V230/9" ARI	ks	-1,000	146,97	-146,97
9	K	Pol207	Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m	ks	1,000	7,91	7,91
10	K	Pol208	Držiak potrubia - DPK 250, 200, 160, 125	ks	4,000	3,32	13,28
11	K	Pol209	Držiak potrubia - DPZ	ks	8,000	2,47	19,76
12	K	Pol210	Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6,	ks	12,000	0,94	11,28
13	K	Pol212	Spojovací, kotviaci a tešiaci materiál	kg	2,000	13,26	26,52
14	K	Pol213	Doprava	kpl	0,075	318,75	23,91
1	K	POI225444	Stenový ventilátor V300/12" ARI	ks	-2,000	215,90	-431,80
2	K	Pol213133	PPV - montáž (podiel)	kpl	-1,000	110,00	-110,00

▫ HSV

HSV

1 893,35

▫ D3.1 Zar.č. 12.1 a 12.2 zmena

1 893,35

3	K	Pol225444.R	Ventilátor CA 200 WE D E	ks	4,000	377,53	1 510,12
4	K	Pol183	- z pozinkovaného plechu do obvodu 250, 40 % tvarovky	bm	2,400	12,58	30,19
5	K	Pol230	Izolácia sacieho, výfukového, odvodného potrubia vzt - Izoflex 15 zo samolepom	m2	6,000	12,92	77,52
6	M	001 SR	Mriežka IGC200 RAL 9010 matná interiér	ks	4,000	33,50	134,00
7	K	POI213133R	PPV - montáž zmien	kpl	4,000	35,38	141,52

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

20 - SO01_01 - ASR - prestupy stavebné

Miesto:

Dátum: 18.1.2022

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

Spracovateľ:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							1 000,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 000,37

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 000,37
2	K	02	Sekacie práce - realizácia zväčšovania otvorov	hod	24,000	10,00	240,00
w		8*3				24,000	
w		Súčet				24,000	
10	K	972056013.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových -0,00037t	cm	100,000	2,62	262,00
w		20*5				100,000	
11	K	972056020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov - železobetónových -0,00118t	cm	60,000	7,59	455,40
w		20*3				60,000	
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,500	8,82	4,41
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,500	10,61	5,31
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,000	0,32	4,80
6	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,500	8,90	4,45
7	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,000	1,00	15,00
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,500	18,00	9,00

Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice Krásna

ČASOVÝ HARMONOGRAM - VCKSS KE Krásna - Odovzdanie 5.10.2022 Rev. 03_Dodatok č.2 - 05.10.2022

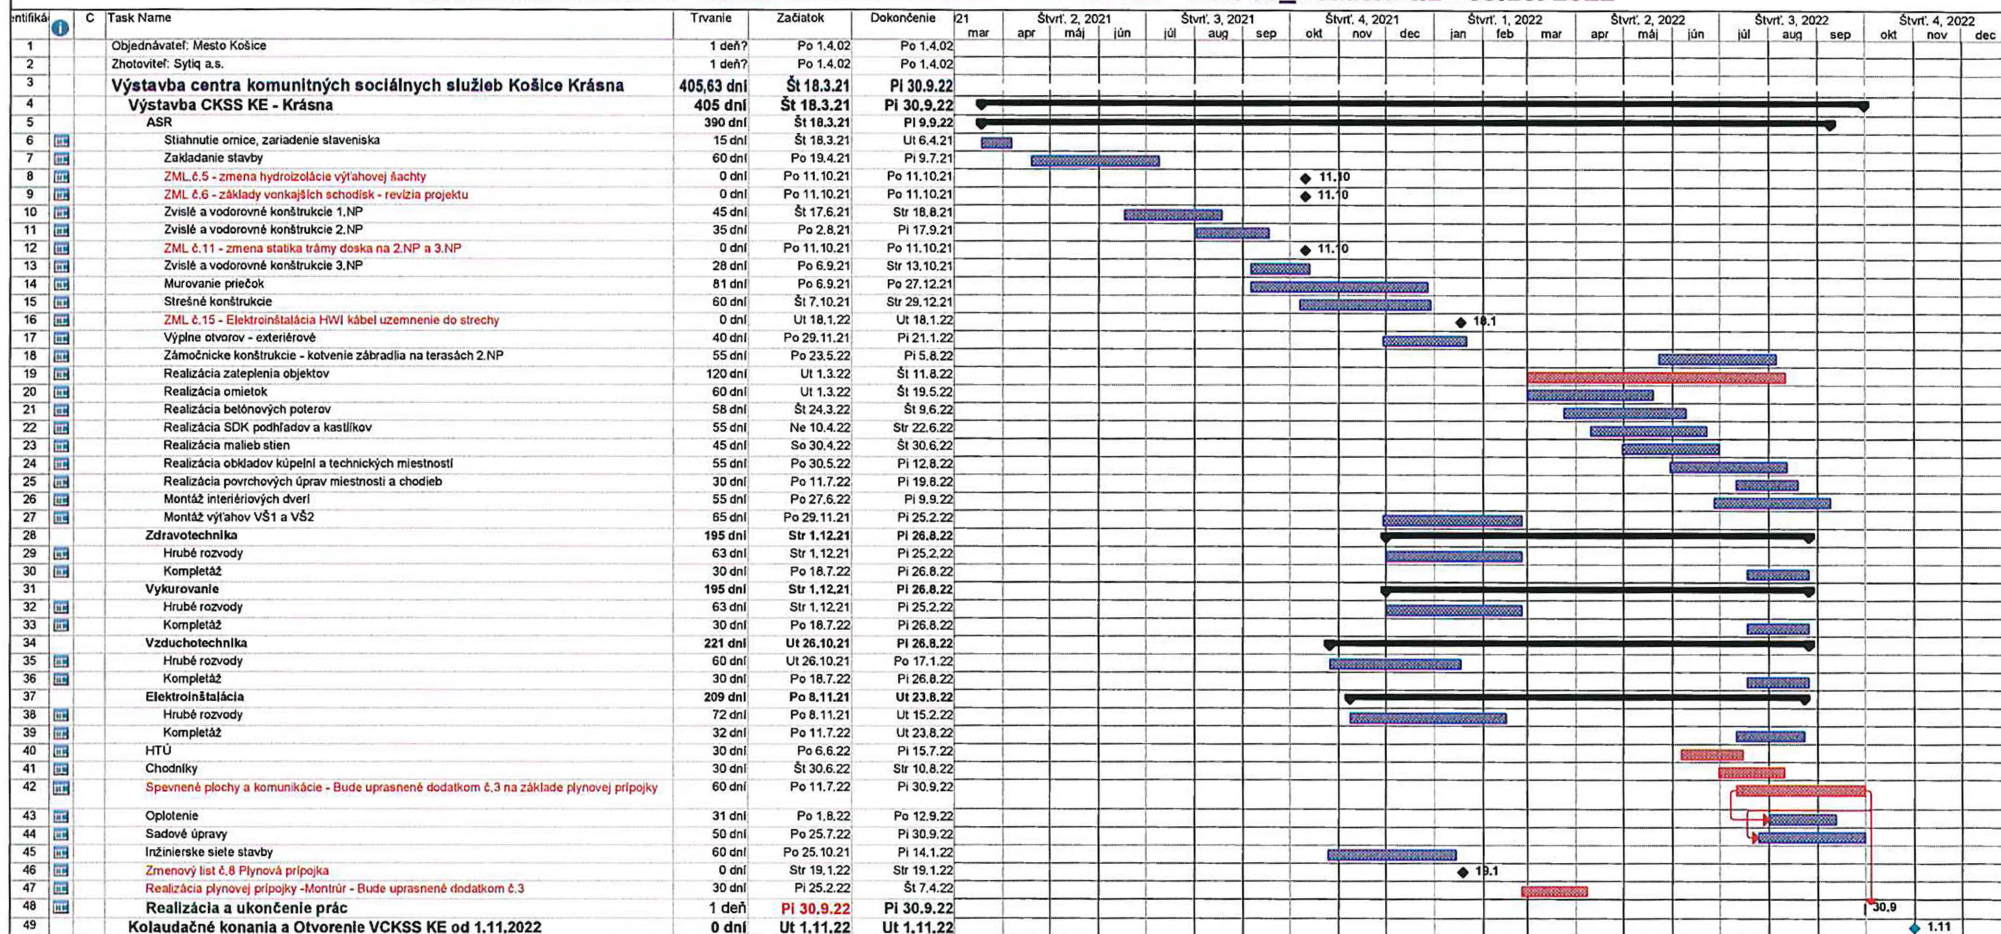

Projekt: VCKSS KE Krásna
Package: REAL PROJECT

Task	Project Summary	Procurement	Manuálna úloha	Iba začiatok	Progress
Split	External Tasks	Execution	Iba trvanie	Iba dokončiť	Deadline
Milestone	External Milestone	Neaktívny medzník	Manuálny súhrn	Externé úlohy	Externý medzník
Summary	Engineering	Neaktívny súhrn	Manuálny súhrn		
