

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO

evid. u objednávateľa: č. 2022001671, evid. u zhotoviteľa: č. 3522EB
„Verejný cintorín – vstupná časť“, Rastislavova 83, Košice“

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČDPH: SK2021186904
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROBAU s.r.o.**
Sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice
IČO: 46738479
DIČ: 2023573794
IČ DPH: SK2023573794
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo:
41216/V
V mene ktorého koná: Ing. Dalibor Blizman, konateľ

(ďalej spoločne tiež „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.07.2022 zmluvu o dielo, ktorej predmetom je realizácia diela
„Verejný cintorín – vstupná časť“, Rastislavova 83, Košice“ (ďalej tiež „Zmluva o dielo“).

Na základe spoločného konsenzu zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu dodatku č. 3
k Zmluve o dielo (ďalej tiež „**dodatok**“).

Článok I

1. Vzhľadom na skutočnosť, že:

- A) Zhotoviteľ je pri vykonávaní prác na diele neustále rušený z dôvodu nerešpektovania zákazu pohybu tretích osôb, prejazdu motorových vozidiel, konania obradov a prevádzky súkromnej pohrebnej služby;
- B) Projektantom diela vypracovaný projekt organizácie výstavby a navrhnuté vytvorenie krytého koridoru pre pohyb návštevníkov a nutný prejazd vozidiel sa nepodarilo zrealizovať;
- C) Počas realizácie stavebných prác na diele bolo zistené, že pre ďalšie pokračovanie v stavebných prácach je nevyhnutné dodanie kruhových mreží v počte 29 ks z dôvodu potreby vysadenia stromov v betónových plochách do podzemného výsadbového prvku Tree-Parker (subdodávateľ určil minimálnu hĺbku výsadby počas realizácie). Bolo potrebné vyrovnať výškový rozdiel medzi vnútornou plochou výsadby a vonkajšou plochou povrchových úprav z hladených betónov, ktorý bol v tomto prípade 10 – 15 cm tak, aby pochôdzna a pojazdná úroveň bola na tej istej úrovni ako plocha výsadby a nevznikali kolízne situácie a zbytočné výškové bariéry. Pre pokračovanie v stavebných prácach v zmysle dohodnutého harmonogramu je nevyhnutná Realizácia kruhových mreží, ktorých dodanie zabezpečuje Objednávateľ;

- D) Skutočnosti uvedené pod bodom A), B) a C) majú negatívny vplyv na dodržanie termínu diela,
sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku č. 3, ktorého predmetom je zmena termínu dodania diela podľa Zmluvy o dielo č. 3522EB (2022001671) zo dňa 4.7.2022.
2. Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách Zmluvy o dielo č. 3522EB (2022001671) zo dňa 4.7.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.11.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 14.8.2023:

Čl. II. bod 1. Zmluvy o dielo sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovných textom:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do piatich (5) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 16.1.2024.“

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vykoná dielo tak, aby boli dodržané všetky jednotlivé míľniky Harmonogramu technologického postupu betonárskych prác na obdobie od 23.10.2023 do 22.12.2023, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná v súlade s Časovým harmonogramom ukončenia diela, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku, a jeho účinnosťou sa stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy o dielo č. 3522EB (2022001671) zo dňa 4.7.2022.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 3. a 4. tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o dielo v znení jej dodatkov a zakladá nárok Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.

Článok II

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha: Harmonogram technologického postupu betonárskych prác 23.10.2023-22.12.2023
Časový harmonogram ukončenia diela
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
5. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.

Objednávateľ

V Košiciach

Dňa 26 -10- 2023

Zhotoviteľ


V Košiciach

Dňa

Za Mesto Košice
Ing. Jaroslav Polaček, primátor

Za EUROBAU s.r.o.
Ing. Dalibor Blizman, konateľ

VEREJNÝ CINTORÍN VSTUPNÁ ČASŤ

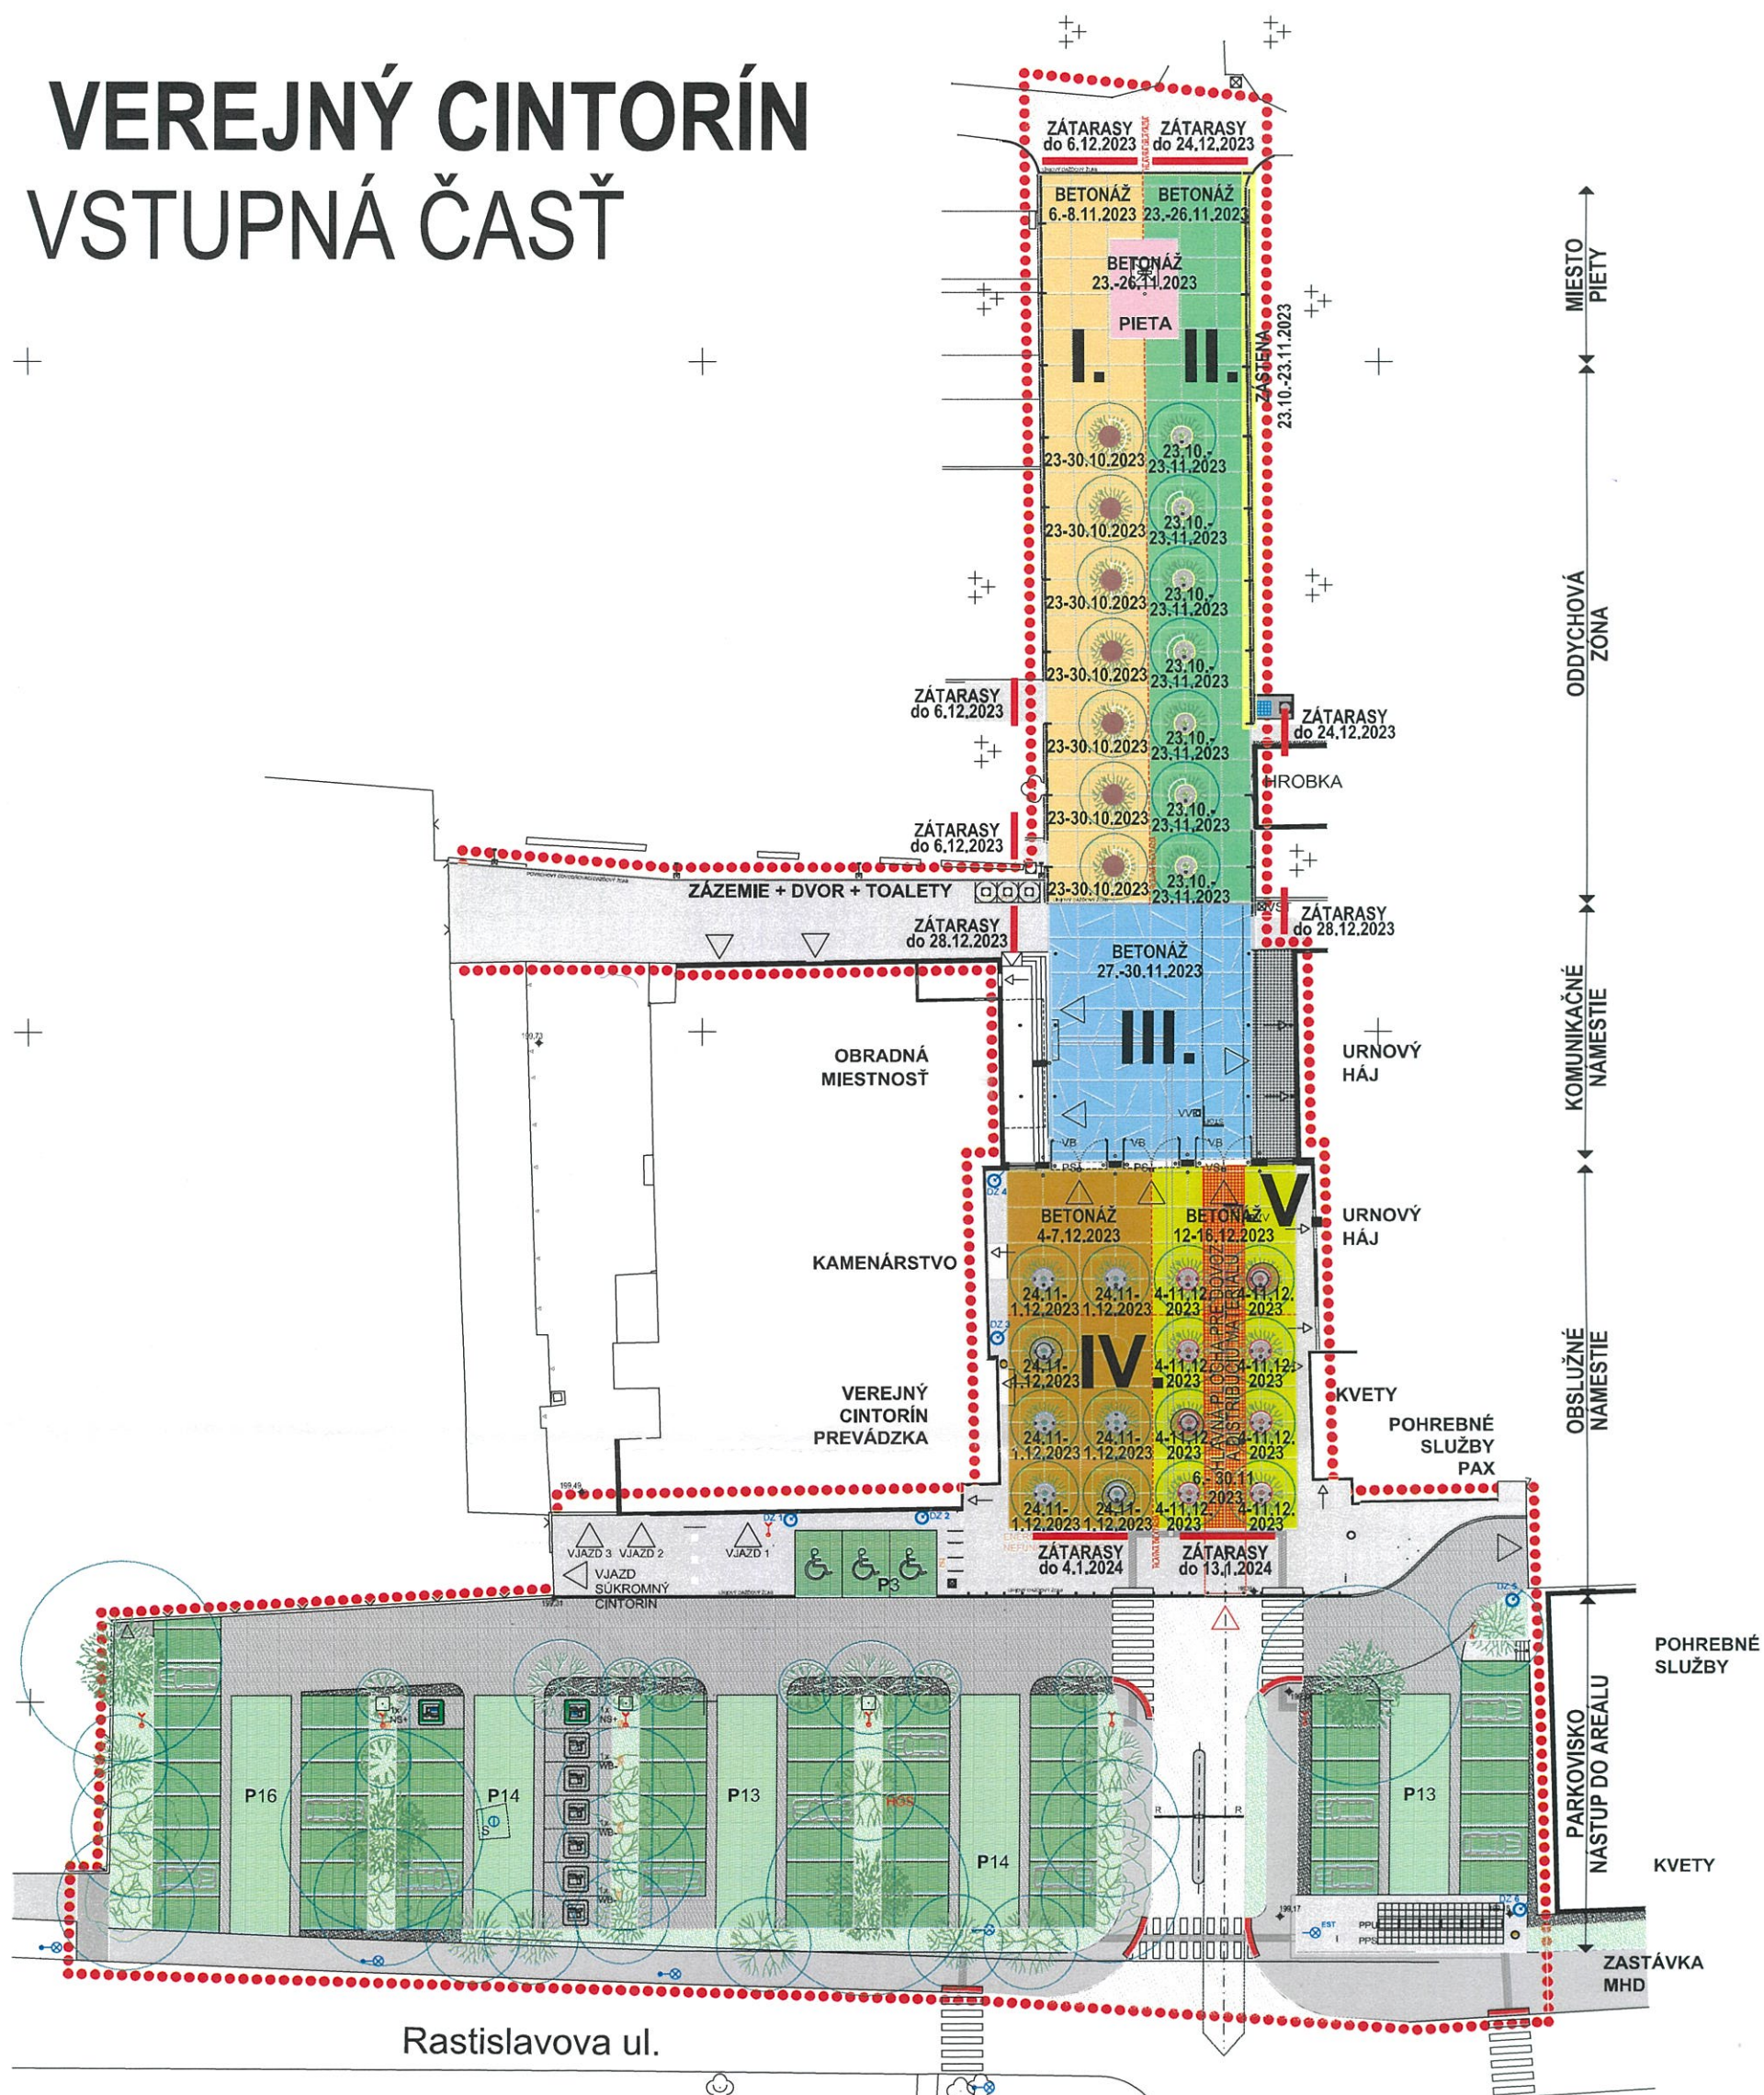

LEGENDA :

I.	23.10.-30.10.2023	STROMOVÁ MREŽA : BETONÁŽ + MONTÁŽ
	6.-8.11.2023	BETÓNOVÁ PLOCHA : BETONÁŽ + DILATÁCIA
	6.11.-30.11.2023	HLAVNÁ PLOCHA PRE DOVOZ A DISTRIBÚCIU MATERIÁLU
II.	23.10.-23.11.2023	OPTICKÁ ZÁSTENA : BETONÁŽ + MONTÁŽ
	23.-26.11.2023	BETÓNOVÁ PLOCHA + PIETA : BETONÁŽ
III.	27.-30.11.2023	BETÓNOVÁ PLOCHA : BETONÁŽ
IV.	24.11.-1.12.2023	STROMOVÁ MREŽA : BETONÁŽ + MONTÁŽ
	4.-7.12.2023	BETÓNOVÁ PLOCHA : BETONÁŽ
V.	4.-11.12.2023	STROMOVÁ MREŽA : BETONÁŽ + MONTÁŽ
	12.-16.12.2023	BETÓNOVÁ PLOCHA : BETONÁŽ

**HARMONOGRAM TECHNOLOGICKÉHO
POSTUPU BETONÁRSKÝCH PRÁC**
23.10.2023 - 22.12.2023

POCHÔDZNOSŤ BETÓNOVÝCH PLÔCH - PO 4 DŇOCH!
POJAZDNOSŤ BETÓNOVÝCH PLÔCH - PO 28 DŇOCH!

Identifikačné číslo	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Usporiadanie úloh
1	1	Verejný cintorín - vstupná časť	383 dni	Str 13.7.22	Ut 16.1.24	1
2	1	I. etapa	366 dni	Str 13.7.22	Pi 22.12.23	2
3	1	SO 01 - Búracie práce a príprava územia	296 dni	Str 13.7.22	Pi 15.9.23	3
4	1	01-1 - Objekt na parkovisku	166 dni	Str 13.7.22	Pi 17.3.23	4
5	1	01-2 - Úprava rozvodov Telekom	296 dni	Str 13.7.22	Pi 15.9.23	5
6	1	01-2-1 - Úprava rozvodov Telekom preložka TF kábla zemné práce	176 dni	Str 13.7.22	Pi 31.3.23	6
7	1	01-2-2 - Úprava rozvodov Telekom preložka TF kábla demontáž,montáž	180 dni	Po 9.1.23	Pi 15.9.23	7
8	1	01-2-3 - Úprava rozvodov Telekom ochrana jestvujúcich TF káblov zemné práce,montáž	37 dni	Po 9.1.23	Ut 28.2.23	8
9	1	SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy	361 dni	Str 13.7.22	Pi 15.12.23	9
10	1	Stromová mreža I. etapa : betónaž + montáž	6 dni	Po 23.10.23	Po 30.10.23	10
11	1	Betónová plocha I. etapa : betónaž + dilatácia	3 dni	Po 6.11.23	Str 8.11.23	11
12	1	Hlavná plocha pre dovoz a distribúciu materiálu	19 dni	Po 6.11.23	Št 30.11.23	12
13	1	SO 04 - Dažďová kanalizácia	350 dni	Str 13.7.22	Št 30.11.23	13
14	1	04-1 - Dažďová kanalizácia	350 dni	Str 13.7.22	Št 30.11.23	14
15	1	04-2 - Automatické zavlažovanie	180 dni	Pi 24.3.23	Št 30.11.23	15
16	1	SO 05 - Elektro a SLP	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	16
17	1	05-1 - Verejné osvetlenie a rozvody NN	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	17
18	1	05-1-1 - Verejné osvetlenie a rozvody nn	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	18
19	1	05-1-2 - Verejné osvetlenie a rozvody nn, Nová RIS	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	19
20	1	05-2 - Kamerový a parkovací systém	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	20
21	1	05-2-1 - Parkovací systém	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	21
22	1	05-2-2 - Kamerový systém	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	22
23	1	SO 06 - SADOVNÍCKE ÚPRAVY	269 dni	Pi 11.11.22	Pi 8.12.23	23
24	1	SO 06 - SADOVNÍCKE ÚPRAVY	193 dni	Str 15.3.23	Pi 8.12.23	24
25	1	06-1 - Prekoreniteľné pôdne bunky	67 dni	Pi 11.11.22	Str 1.3.23	25
26	1	II. etapa	383 dni	Str 13.7.22	Ut 16.1.24	26
27	1	01-2 - Úprava rozvodov Telekom	121 dni	Pi 31.3.23	Pi 15.9.23	27
28	1	01-2-1 - Úprava rozvodov Telekom preložka TF kábla zemné práce	44 dni	Pi 31.3.23	Str 31.5.23	28
29	1	01-2-2 - Úprava rozvodov Telekom preložka TF kábla demontáž,montáž	121 dni	Pi 31.3.23	Pi 15.9.23	29
30	1	01-2-3 - Úprava rozvodov Telekom ochrana jestvujúcich TF káblov zemné práce,montáž	121 dni	Pi 31.3.23	Pi 15.9.23	30
31	1	SO 02 - Architektúra	191 dni	Pi 31.3.23	Pi 22.12.23	31
32	1	02-1 - Optická zástena	85 dni	Po 31.7.23	Pi 24.11.23	32
33	1	Optická zástena II. Etapa : betónaž + montáž	24 dni	Po 23.10.23	Št 23.11.23	33
34	1	02-2 - Pietne miesto	191 dni	Pi 31.3.23	Pi 22.12.23	34
35	1	02-3 - Schodiska	96 dni	Str 9.8.23	Str 20.12.23	35
36	1	02-4 - Vstupný portál	190 dni	Po 3.4.23	Pi 22.12.23	36
37	1	02-5 - Prístrešok + predajný pult	125 dni	Po 3.7.23	Pi 22.12.23	37
38	1	02-6 - Z stĺpik, P+V stĺpik, Stojan na bicykle	95 dni	Po 14.8.23	Pi 22.12.23	38
39	1	02-7 - Lavička, infotabula	35 dni	Po 6.11.23	Pi 22.12.23	39
40	1	02-8 - Kôš na odpad, kôš na separovaný odpad, výtok vody	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	40
41	1	02-9 - Podzemný kontajner	8 dni	Po 30.10.23	Str 8.11.23	41
42	1	SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy	208 dni	So 1.4.23	Ut 16.1.24	42
43	1	Stromová mreža II. Etapa : betónaž + montáž	24 dni	Po 23.10.23	Št 23.11.23	43
44	1	Betónová plocha II. Etapa : pieta - betónaž	3 dni	Št 23.11.23	Ne 26.11.23	44
45	1	Betónová plocha III. Etapa : betónaž	4 dni	Po 27.11.23	Št 30.11.23	45
46	1	Stromová mreža IV. Etapa : betónaž + montáž	6 dni	Pi 24.11.23	Pi 1.12.23	46
47	1	Betónová plocha IV. Etapa : betónaž	4 dni	Po 4.12.23	Št 7.12.23	47
48	1	Stromová mreža V. Etapa : betónaž + montáž	6 dni	Po 4.12.23	Po 11.12.23	48
49	1	Betónová plocha V. Etapa : betónaž	5 dni	Ut 12.12.23	So 16.12.23	49
50	1	Pojazdnosť betónových plôch po 28 dňoch	23 dni	So 16.12.23	Ut 16.1.24	50
51	1	SO 04 - Dažďová kanalizácia	366 dni	Str 13.7.22	Pi 22.12.23	51
52	1	04-1 - Dažďová kanalizácia	361 dni	Str 13.7.22	Pi 15.12.23	52
53	1	04-2 - Automatické zavlažovanie	5 dni	Po 18.12.23	Pi 22.12.23	53
54	1	SO 05 - Elektro a SLP	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	54
55	1	05-1 - Verejné osvetlenie a rozvody NN	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	55
56	1	05-1-1 - Verejné osvetlenie a rozvody nn	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	56
57	1	05-1-2 - Verejné osvetlenie a rozvody nn, Nová RIS	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	57
58	1	05-2 - Kamerový a parkovací systém	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	58
59	1	05-2-1 - Parkovací systém	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	59
60	1	05-2-2 - Kamerový systém	15 dni	Po 4.12.23	Pi 22.12.23	60
61	1	SO 06 - SADOVNÍCKE ÚPRAVY	200 dni	Po 6.3.23	Pi 8.12.23	61
62	1	SO 06 - SADOVNÍCKE ÚPRAVY	188 dni	Str 22.3.23	Pi 8.12.23	62
63	1	06-1 - Prekoreniteľné pôdne bunky	24 dni	Po 6.3.23	Št 6.4.23	63
