DODATOK č. 3

K ZMLUVE O DIELO č. 2022000331 zo dňa 18.02.2022

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Košice**

so sídlom:	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO:	00 691 135
DIČ:	2021186904
IČ DPH:	SK 2021186904
štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Polaček, primátor
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu (IBAN):	SK03 5600 0000 0004 4248 6001
SWIFT (BIC):	KOMASK2X

(ďalej len **„Objednávateľ"**)

a

Zhotoviteľ: **BETPRES, s. r. o.**

so sídlom:	Boženy Němcovej 1698 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	31 684 343
DIČ:	2020527861
IČ DPH:	SK2020527861
štatutárny orgán:	p. Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti Ing. Tomáš Barkóci – konateľ spoločnosti Ing. Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti Ing. Roland Ďurko – konateľ spoločnosti
bankové spojenie:	VÚB, a. s.
číslo účtu (IBAN):	SK07 0200 0000 0002 1904 1632
SWIFT (BIC):	SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vo vložke č. 1502/P

(ďalej len **„Zhotoviteľ"**)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**")

*uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 01/1766/2022 - 2022000331 zo dňa 18.02.2022 (ďalej len **„Zmluva o dielo"**), tento Dodatok č. 3 (ďalej len **„Dodatok"**) :*

Článok 1
PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa upravuje v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú Cenu Diela uvedenú v bode 1 článku IV. Zmluvy o dielo o **232 650,23 € bez DPH, 279 180,28 € s DPH.**

3. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 1 článku IV. CENA Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne:**

1. *Celková cena za kompletné vykonanie diela v rozsahu oceneného výkazu výmer je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.. Cenu diela je možné meniť len o písomné dohodnuté zmeny diela, a to na základe písomného dodatku podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami.*

Cena diela bez DPH je: *2 575 871,15 €*

(slovom: Dvamiliónypäťstosedemdesiatpäťtisícosemstosedemdesiatjedeneur a pätnásť centov bez DPH)

DPH 20 % *515 174,23 €*

Cena celkom s DPH: *3 091 045,38 €*

(slovom: Trimiliónydeväťdesiatjedentísícštyridsaťpäťeur a tridsaťosem centov s DPH)

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu bez DPH s upozornením na prenesenie daňovej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.".

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jej nasledovné prílohy :

Príloha č. 1 – Rekapitulácia zmenových listov + rozpočet

- Zmenový list č. 4 – Základy pod prístavbu.
- Zmenový list č. 5 – Nová skladba podlahy pod palubovku a tribúnami.
- Zmenový list č. 6 – Spevnené plochy okolo objektu.
- Zmenový list č. 8 – Zmenšenie plochy palubovky + doplnok.
- Zmenový list č. 11 – Zámena hydroizolácii spodnej stavby
- Zmenový list č. 13 – Otváranie mantinelov
- Zmenový list č. 14 – Zámena omietok stropov za sadrokartón.
- Zmenový list č. 15 – Stabilizácia omietok.
- Zmenový list č. 16 – Skrinka DPMK a EPS rozvody turniketov.
- Zmenový list č. 17 – ASR severná stena okná.
- Zmenový list č. 18 – Severná tribúna – úprava povrchov schodníc.
- Zmenový list č. 19 – ZTI.
- Zmenový list č. 20 – Zmena materiálu palubovej podlahy – Grabo jaseň - čiarovanie,
- Zmenový list č. 21 – Oplechovanie záveternej lišty.
- Zmenový list č. 22 – Tienenie dopojenie ELI.
- Zmenový list č. 23 - Poškodenie strešnej krytiny.
- Zmenový list č. 24 – ELI rozvody k audiotechnike.
- Zmenový list č. 25 – Zámena terazza za dlažbu.
- Zmenový list č. 26 – Ochrana proti vtákom.
- Zmenový list č. 27 – Audio a ŠK k LED.

V Košiciach, dňa 14-10-2022

Vo Vranove nad Topľou, dňa 06.10.2022

Objednávateľ :

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Zhotoviteľ:

Ing. Roland Ďurko
konateľ spoločnosti BETPRES, s.r.o.

Ing. Tomáš Barkóci
konateľ spoločnosti BETPRES, s.r.o.

Stavba: **„ ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia"**

dňa:09.09.2022

Podklady k dodatku č.3

Rekapitulácia zmenových konaní k dod.č.3

Dodávateľ: **BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, Vranov nad Topľou**
Stavba: **„ ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia"**

Stavbyvedúci:

Por.číslo	Názov a popis	Dátum zaslania	Cenový navrh Betpres, s.r.o.	Stanovisko investor	Stav
	Cena k ZoD		**2 198 000,00**		
4.	ZK č.4 Základy pod prístavbou	25.04.2022	31 109,90		spracované
5	ZK č.5 Nová skladba podlahy pod palubovkou a tribunami	08.09.2022	38 927,08		spracované
6	ZK č.6 Sp.plochy okolo objektu	09.05.2022	34 700,71		spracované
8	ZK č.8 Zmenšenie plochy palubovky + doplnok	12.07.2022	-9 807,56		spracované
11	ZK č.11 Zamena hydroizolácií spodnej stavby	20.06.2022	-373,94	odsúhlasené 10.08.2022	spracované
13	ZK č.13 Otvaranie mantinelov,úpava krokiev,kom.páska	02.06.2022	8 334,51		spracované
14	ZK č.14 Zamena omietok stropov za sadrokarton	04.05.2022	7 609,49		spracované
15	ZK č.15 Stabilizácia omietok	01.07.2022	33 963,79		spracované
16	ZK č.16 Skrina DPMK a EPS rozvody k turniketom	09.06.2022	905,58	odsúhlasené 10.08.2022	spracované
17	ZK č.17 ASR severná stena okná	02.06.2022	2 097,79		spracované
18	ZK č.18 Severna tribuna- úprava povrchov schodníc	08.09.2022	43 175,63		spracované
19	ZK č.19 ZTI	02.06.2022	2 500,04		spracované
20	ZK č.20 Zmena materiálu palubovej podlahy-čiarovanie				spracované
	Grabo jasen	17.06.2022	25 024,20	odsúhlasené 17.06.2022	spracované
21	ZK č.21 Oplechovanie záveternej lišty	12.07.2022	8 345,60	odsúhlasené	spracované
22	ZK č.22 Tienenie dopojenie ELI	10.08.2022	1 438,14	odsúhlasené 10.08.2022	spracované
23	ZK č.23 Poškodenie strešnej krytiny	26.07.2022	3 057,94		spracované
24	ZK č.24 ELI rozvody k audiotechnike	12.08.2022	3 942,04	odsúhlasené 15.05.2022	spracované
25	ZK č.25 Zámena terazza za dlažbu	06.092022	-16 095,41		spracované
26	ZK č.26 Ochrana proti vtákom	08.09.2022	1 799,04		spracované
27	ZK č.27 Audio a ŠK k LED	08.09.2022	11 995,66		spracované
Σ	**EUR Spolu:**		**232 650,23**		

Aktualizácia: 09.09.2022

SH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 27 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:08.09.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Audio a ŠK k LED***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky projektanta a investora boli spracované viac práce , ktoré neboli predmetom ZoD a PD.

Prace boli naprojektované ako predpríprava k montáži audio a LED prvkov.

viď . PD

Oznámil: Dátum: **08.09.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

SH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:27**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:	**08.09.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* ____	*Hand:* _____		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.27
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***11 995,66*** **€ bez DPH**

Pripravil :
OTÚ Betpres
Dátum **08.09.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.27: ***11 995,66*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 209 995,66 € bez DPH**

Schválil:
generálny projektant
Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.27 Audio a ŠK k LED	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	5 821,54
2		Montáž	6 174,12
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 995,66
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	11 995,66
24	DPH 20,00 % z 11 995,66	2 399,13
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**14 394,79**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-gama	**ZK č.27 Audio a ŠK k LED**	**11 995,66**	**2 399,13**	**14 394,79**	**0,00**	**11 995,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
gama 1	ZK č. 27 Audio	10 315.96	2 063,19	12 379,15	0.00	10 315,96	0,00	0,00	0,00
gama 2	ZK č.27 ŠK k LED	1 679,70	335,94	2 015,64	0,00	1 679,70	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**11995,66**	**2399,13**	**14 394,79**	**0,00**	**11 995,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.27 Audio a ŠK k LED	EČO	
Názov časti	ZK č. 27 Audio	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 167,34	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	5 148,62	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 315,96	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	10 315,96
24	DPH 20,00 % z 10 315,96	2 063,19
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**12 379,15**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.27 Audio a ŠK k LED
Časť: ZK č. 27 Audio

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 6. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
C		**Inštalačný materiál**		**1,000**	**#######**	**10 315,96**	**0,000**
C1		**Vypínače, zásuvky**		**1,000**	**10 315,96**	**10 315,96**	**0,000**
187	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	18,000	2,56	46,08	0,000
188	*345410013000.S*	*Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66*	*ks*	*18,000*	*2,19*	*39,42*	*0,000*
277	210020305	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery	m	60,000	8,20	492,00	0,000
278	*345750008700*	*Žľab káblový 125x50 mm*	*m*	*60,000*	*7,38*	*442,80*	*0,000*
279	*345750011500*	*Kryt káblového žľabu 125 mm*	*m*	*60,000*	*0,31*	*18,60*	*0,000*
280	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	1 000,000	0,15	150,00	0,000
282	*345955K032*	*Držiak UDF 12*	*ks*	*1 000,000*	*0,16*	*160,00*	*0,000*
		plošina	kpl	1,000	1 159,60	1 159,60	0,000
		prierazy, výseky	kpl	1,000	191,88	191,88	0,000
		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	296,000	1,07	316,72	0,000
		Kábel pevný CHKE-R-J 2x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	*m*	*296,000*	*1,01*	*298,96*	*0,000*
		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	2 320,000	1,07	2 482,40	0,000
		Kábel pevný CHKE-R-J 2x2,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	*m*	*2 320,000*	*1,57*	*3 642,40*	*0,000*
		Kábel audilinka 1x2x0,22	m	200,000	1,07	214,00	0,000
		Kábel audiolinka 1x2x0,22	*m*	*200,000*	*1,57*	*314,00*	*0,000*
		podlahová krabica - montáž	ks	2,000	47,97	95,94	0,000
		podlahová krabica 4M POP	*ks*	*2,000*	*125,58*	*251,16*	*0,000*
		Celkom				**10 315,96**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**	JKSO	
Názov objektu	**ZK č.27 Audio a ŠK k LED**	EČO	
Názov časti	**ZK č.27 ŠK k LED**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	654,20	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 025,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 679,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 679,70
24	DPH 20,00 % z 1 679,70	335,94
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 015,64**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.27 Audio a ŠK k LED
Časť: ZK č.27 ŠK k LED

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 6. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		**Práce a dodávky M**		**1,000**	**1 679,70**	**1 679,70**	**0,000**
		ŠK - DODÁVKA				**291,20**	**0,000**
12	*RAB-VP-X21-A2*	*Držiak patch káblov s hĺbkou oka 73 mm, 19" 1U kovový , KELine alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*5,40*	*10,80*	*0,000*
13	*KEP-C6A-S-HD*	*Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, čierny, komplet osadený, KELine alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*93,00*	*186,00*	*0,000*
14	*5014A-B1018*	*Tango Nosná maska kom. zásuvky dvojnás.; čierna*	*ks*	*8,000*	*2,30*	*18,40*	*0,000*
15	*3901A-B10 B*	*Tango Rámček jednonásobný; biela*	*ks*	*8,000*	*1,20*	*9,60*	*0,000*
16	*5014A-A100 B*	*Tango Kryt zásuvky komunikačnej; biela*	*ks*	*8,000*	*0,70*	*5,60*	*0,000*
17	*KEJ-C6A-S-HD*	*Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KELine, KEJ-C6A-S-HD alebo ekvivalent*	*ks*	*16,000*	*3,20*	*51,20*	*0,000*
18	*Pol60*	*Krabica univerzálna z PVC KU 68,*	*ks*	*8,000*	*1,20*	*9,60*	*0,000*
		ŠK - MONTÁŽ				**247,00**	**0,000**
29	Pol65	Montáž držiaka patch káblov	ks	2,000	12,00	24,00	0,000
30	Pol66	Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45	ks	2,000	6,00	12,00	0,000
31	Pol67	Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45	ks	16,000	3,00	48,00	0,000
32	Pol68	Montáž krabice prístrojovej KU 68	ks	8,000	2,50	20,00	0,000
33	Pol69	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	8,000	2,50	20,00	0,000
34	Pol70	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	8,000	3,00	24,00	0,000
35	Pol71	Káblová forma v rozvádzači	ks	2,000	1,50	3,00	0,000
38	Pol74	Značenie zásuviek	ks	16,000	1,00	16,00	0,000
39	Pol75	Značenie prípojných miest na strane rozvadzača	ks	16,000	1,00	16,00	0,000
40	Pol76	Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu	mer	16,000	4,00	64,00	0,000
Káble		**Káble**				**363,00**	**0,000**
1	*KE550HS23/1E-B2ca*	*KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 alebo ekvivalent*	*m*	*660,000*	*0,55*	*363,00*	*0,000*
		KÁBLOVÉ TRASY - MONT				**778,50**	**0,000**
57	Pol82	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	660,000	0,15	99,00	0,000
58	Pol83	Prieraz steny	ks	14,000	15,00	210,00	0,000
59	Pol84	Kábel volne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu, zatiahnutý do rúrky	m	660,000	0,70	462,00	0,000
61	Pol58	Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm	ks	50,000	0,15	7,50	0,000
		Celkom				**1 679,70**	**0,000**

SH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 26 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:08.09.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: ____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Ochrana proti vtákom***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky z KPU a odsúhlasenia projektanta a investora boli spracované viac práce na osadenie ochrany proti vtákomn.

vid.Zápis z KPU

Oznámil:
Issued by:

Dátum: **08.09.2022**
Date: _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

SH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:26**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:	**08.09.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* _____	*Hand:* _____		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.26
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***1 799,04*** **€ bez DPH**

Pripravil BET
Dátum **08.09.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.26: ***1 799,04*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 199 799,04 € bez DPH**

Schválil:
generálny projektant
Dátum:
Date:

KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
KOŠICE

Záznam

ZO ZISTENIA NA MIESTE SAMOM NA BUDOVE ANGELS ARÉNA, NKP JAZDIAREŇ, VO VLASTNÍCTVE MESTA KOŠICE

spísaný v KOŠICIACH dňa 25.08.2022

Prítomní: za KPÚ Košice : ....

....

vlastník, správca: —

....

ostatní prítomní: STAVBYVEDÚCI, ... BETPRES S.R.O.

....

....

Predmet rokovania, závery:

1. KPÚ OVERIL PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU-VSTUPNÝCH DVERÍ-BRÁN, ÚPRAVY OKIEN A ZASKLENÝCH DVERÍ, Č.V. 24, SPRACOVANÚ SÚHLASÍ S VÝROBOU A OSADENÍM PODĽA UVEDENÉHO VÝKRESU.
KPÚ OVERIL DOKONČENOSŤ ZÁPADNEJ FASÁDY, PRED REALIZÁCIOU KRYCIEHO NÁTERU.
NA SEVERNEJ FASÁDE KPÚ SÚHLASÍ S REALIZÁCIOU ZÁBRAN PROTI HOLUBOM, NA VYSTUPUJÚCICH ČASTIACH FASÁDY.
VETRACIE OKIENKA NA SEVERNEJ FASÁDE SÚ KRYTÉ —

1/2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.26 Ochrana proti vtákom	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	1 234,56
3	PSV	Dodávky	369,92
4		Montáž	194,56
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 799,04
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 799,04
24	DPH 20,00 % z 1 799,04	359,81
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 158,85**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER


Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**
Objekt: **ZK č.26 Ochrana proti vtákom**

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 169
Dátum: 6. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 799,04**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 234,56**
1	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	16,000	77,16	1 234,56
	765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**564,48**
2	765363042.Spc	Ochranný pás proti vtákom šírky 10 cm oceľový fabiony a väznice	m	128,000	4,41	564,48
		84+44		128,000		
		Celkom				**1 799,04**

HROTOVÝ PÁS PROTI VTÁKOM - 3 RADY, DĹŽKA 50 CM, 50 NEREZOVÝCH HROTOV



Kód produktu: T-SPIKES
Značka: AGROFORTEL

3,29€
2,74€ BEZ DPH

SKLADOM

− 1 + PRIDAŤ DO KOŠÍKA

POPIS PORADŇA

S týmito hrotmi z nerezovej ocele zabránite pristátie holubov, čajok, škorcov, vrán alebo iných vtákov na hrany, rímsy, žľaby alebo iné miesta.

Čapy z nerezovej ocele sú namontované na plastovom pásku, ktorý je opatrený predvŕtanými otvormi, čo uľahčuje ich montáž.

Expedícia balíkov aj napriek koronavíru prebieha bez problému.
Telefónne hovory obmedzte, prosím, iba na dôležité, aby sme mohli rýchlo a efektívne pripravovať Vaše objednávky.

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 25 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:06.09.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Zamena terazzo za dlažby***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref.:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref.:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe odsúhlasenia projektanta a investora boli spracované menej práce na zámenu terazzových podláh za keramické.

viď.Zápis z KPU

Oznámil: Dátum: **06.09.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

SH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:25**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:	**06.09.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier: ____*	*Fax: _____*	*Hand: _____*		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.25
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***-16 095,41*** **€ bez DPH**

Pripravil :
ÚTÚ Betpres
Dátum 06.09.2022
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.25: ***-16 095,41*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 181 904,59 € bez DPH**

Schválil:
generálny projektant
Dátum:
Date:

KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
KOŠICE

Záznam

Zo ZISTENIA NA MIESTE SAMOM, NA NKP JÁZDIAREŇ/ANGELS ARÉNA, HVIEZDOSLAVOVA 8, NA P.Č. 265/1, EVIDOVANEJ V ÚZPF Č. 12238/8, VO VLASTNÍCTVE MESTA KOŠICE, TR. SNP 48/A, KE

spísaný v KOŠICIACH dňa 4.8.2022

Prítomní: za KPÚ Košice :

vlastník, správca:

ostatní prítomní: ZHOTOVITEĽ STAVBY
- STAVBYVEDÚCI

Predmet rokovania, závery:

Z DÔVODU NEDOSTUPNOSTI TOVARU BOLA ZADEFINOVANÁ PLATBA (PRE CELÝ OBJEKT) ZA:

RAKO CONCEPT ŠEDÁ MATNÁ, ROZMER 45 x 45 CM.

OBKLAD STIEN OSTÁVA, TAK AKO BOL PÔVODNE ZADEFINOVANÝ (SVETLÝ PASTEL LATTE MAT)

ZAPÍSAL:

PRÍTOMNÍ:

(VSTUPNÝCH 2 BRÁN)

(B) V PRÍPADE DVERÍ, KPÚ KOŠICE POŽADUJE DIELENSKÝ VÝKRES (PODOBNE, AKO V PRÍPADE OKIEN). Z DIELENSKÉHO VÝKRESU MÁ BYŤ ZREJME AKÝ BUDE RELIÉF BRÁN A AKÉ BUDÚ POUŽITÉ PROFILY. VÝPLNE NESMÚ BYŤ V ŠTÝLE „TATRANSKÝ PROFIL." DIAGONÁLNE VÝPLNE MAJÚ BYŤ UKLADANÉ NA ZRAZ, AKO VLYS.

(C) KPÚ DO STREDY 27. 07. 2022 SA VYJADRÍ K VÝKRESU POHĽADY – NOVÝ STAV, Č. VÝKRESU 16 A K VÝKRESU STRIEŠIDZ ZO SEVERNEJ STRANY.

(D) DLAŽBY V INTERIÉRI MAJÚ BYŤ JEDNOTNÉ – UKLADANÉ DIAGONÁLNE. BOL VYBRATÝ TYP 40 x 40 cm „KALGYT SZARY". (SVETLÁ SIVÁ, FARBA SVETLÝ CEMENT, MATNÁ)
OBKLAD STIEN: TUBADZIN, PASTEL 20 x 20 cm „PASTEL LATTE MAT" (SVETLÝ OKER SO SIVOU, MATNÁ).

VO VŠETKÝCH INTERIÉROCH, V CELOM OBJEKTE BUDÚ JEDNOTNE POUŽITÉ UVEDENÉ DLAŽBY A BUDÚ JEDNOTNE KLADENÉ NAKOSO (DIAGONÁLNE/45°).
STÁROVACIA HMOTA V PRÍPADE DLAŽIEB AJ V PRÍPADE OBKLADOV MÁ BYŤ TÓN V TÓNE (T.J. ROVNAKÁ, AKO JE FARBA MATERIÁLU).

(E) POPĽA KPÚ KOŠICE BY BOLO VHODNÉ OBNOVIŤ NÁTER HERAKLITU NA STROPE HALY, A TO Z DÔVODU ZJEDNOTENIA NÁTERU PO PROTIPOŽIARNOM NÁTERE, PO PRACHU ZO STAVBY, PO ROZLIČNÝCH POŠKODENIACH, ABY SA DOCIELIL ROVNAKÝ VZHĽAD V CELEJ HALE. FAREBNOSŤ URČÍ KPÚ.

ZAPÍSAL: I
PRÍTOMNÍ:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.25 Zámena terazzo za dlažby	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	05.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 261,47	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	-23 356,88	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-16 095,41	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	-16 095,41
24	DPH 20,00 % z -16 095,41	-3 219,08
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-19 314,49**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-alfa	**ZK č.25 Zámena terazzo za dlažby**	**-16 095,41**	**-3 219,08**	**-19 314,49**	**0,00**	**-16 095,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
alfa-1	ZK č.25 Zamena terazzo za dlažby ZoD	14 308,42	2 861,68	17 170,10	0.00	14 308,42	0,00	0,00	0,00
alfa-2	ZK č.25 Zamena terazzo za dlažby Cenkros	1 375,97	275,19	1 651,16	0,00	1 375,97	0,00	0,00	0,00
alfa-3	ZK č.25 Zamena terazzo za dlažby Menej práce	-31 779,80	-6 355,96	-38 135,76	0.00	-31 779,80	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**-16095,41**	**-3219,08**	**-19 314,49**	**0,00**	**-16 095,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.25 Zámena terazzo za dlažby

Časť: ZK č.25 Zamena terazzo za dlažby ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 169

Miesto:

Dátum: 5. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**14 308,42**
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**14 308,42**
1	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore	m2	394,040	20,00	7 880,80
2	*597740001700*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*413,742*	*15,00*	*6 206,13*
3	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,013	22,12	221,49
		Celkom				**14 308,42**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**
Objekt: **ZK č.25 Zámena terazzo za dlažby**
Časť: **ZK č.25 Zamena terazzo za dlažby Cenkros**

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 169
Dátum: 5. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 375,97**
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**1 375,97**
4	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	134,000	3,43	459,62
5	771415015.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 200 mm	m	95,000	5,28	501,60
6	*597740001700*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*27,650*	*15,00*	*414,75*
		134*0,1		13,400		
		95*0,15		14,250		
		Súčet		27,650		
		Celkom				**1 375,97**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**
Objekt: **ZK č.25 Zámena terazzo za dlažby**
Časť: **ZK č.25 Zamena terazzo za dlažby Menej práce**

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 169
Dátum: 5. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**-31 779,80**
	773	**Podlahy z liateho teraca**				**-31 779,80**
1	773512010.S	Podlahy z prírodného terazza - obruby šírky do 100 mm	m	-134,360	25,00	-3 359,00
2	773512020.S	Podlahy z prírodného terazza - obruby šírky nad 100 do 200 mm	m	-95,210	30,00	-2 856,30
3	773521260.S	Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr. 20 mm	m2	-393,300	65,00	-25 564,50
		Celkom				**-31 779,80**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN
CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 24
NOTICE NO.

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:12.08.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Silové napojenie audiotechniky***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na požiadavku projektanta boli spracované práce na silové napojenie audiotechniky, čo nebolo obsiahnuté v PD.

Práce boli naprojektované ako predpríprava k montáži audiotechniky.

viď.samostatná PD

Oznámil: Dátum: **12.08.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Prikaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:24**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:**12.08.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*
			Vranov nad Topľou	
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**	
Sent by:	*Courier: ____*	*Fax: _____*	*Hand: _____*	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.24
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***3 942,04*** **€ bez DPH**

Pripravil :
OTÚ Betpres
Dátum 12.08.2022
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.24: ***3 942,04*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 201 942,04 € bez DPH**

Schválil:
generálny projektant
Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.24 ELI rozvody k audiotechnike	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.08.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 257,70	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 684,34	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 942,04	12	DŇ (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 942,04
24	DPH 20,00 % z 3 942,04	788,41
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 730,45**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-y	ZK č.24 ELI rozvody k audiotechnike	3 942,04	788,41	4 730,45	0,00	3 942,04	0,00	0,00	0,00
y-1	ZK č.24 Eli rozvody k audiotechnike ZoD	2 093,05	418,61	2 511,66	0,00	2 093,05	0,00	0,00	0,00
y-2	ZK č.24 Eli rozvody k audiotechnike Cenkros	1 848,99	369,80	2 218,79	0,00	1 848,99	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**3942,04**	**788,41**	**4 730,45**	**0,00**	**3 942,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.24 ELI rozvody k audiotechnike	EČO	
Názov časti	ZK č.24 Eli rozvody k audiotechnike ZoD	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.08.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 1 257,70	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 835,35	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 093,05	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 093,05
24	DPH 20,00 % z 2 093,05	418,61
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 511,66**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.24 ELI rozvody k audiotechnike
Časť: ZK č.24 Eli rozvody k audiotechnike ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 12. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	21-M	**Elektromontáže**				**2 093,05**	**0,000**
3	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	15,000	2,56	38,40	0,000
4	*345410013000.S*	*Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66*	*ks*	*15,000*	*2,19*	*32,85*	*0,000*
5	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	15,000	3,59	53,85	0,000
6	*345520000450.S*	*Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet*	*ks*	*15,000*	*3,33*	*49,95*	*0,000*
1	210881217.Sa	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	980,000	0,72	705,60	0,000
2	*KPE000000966*	*Kábel pevný CHKE-R-J 3x2,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový*	*m*	*980,000*	*1,13*	*1 107,40*	*0,000*
7	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvítanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	250,000	0,15	37,50	0,000
8	*345955K032*	*Držiak UDF 12*	*ks*	*250,000*	*0,27*	*67,50*	*0,000*
		Celkom				**2 093,05**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.24 ELI rozvody k audiotechnike	EČO	
Názov časti	ZK č.24 Eli rozvody k audiotechnike Cenkros	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.08.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	1 848,99
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 848,99
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 848,99
24	DPH 20,00 % z 1 848,99	369,80
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 218,79**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.24 ELI rozvody k audiotechnike
Časť: ZK č.24 Eli rozvody k audiotechnike Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 12.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21-M		**Elektromontáže**				**1 848,99**	**0,000**
12	9	Uprava rozvádzača HR1	kpl	1,000	650,00	650,00	0,000
10		Úprava rozvádzača RS1	kpl	1,000	850,04	850,04	0,000
11		prierazy, výseky	kpl	1,000	348,95	348,95	0,000
		Celkom				**1 848,99**	**0,000**

Dobrý deň, súhlasím z realizáciou predmetných prác.

Odd. výstavby, investícií a stavebného úradu
Referát výstavby
Magistrát mesta Košice
Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice

Od: Betpres s.r.o
Odoslané: piatok 12. augusta 2022 12:49
Komu
Predmet: (Externý) SH Košice ZK č.24 Eli rozvody k audiotechnike

Na základe podkladov od projektanta Vám zasielam k odsúhlasenie viac prác e na eli rozvody k audiotechnike.
Prosím o zaslanie stanoviska aby som mohol tieto práce čím skôr objednať u subdodávateľa.
Dakujem.

príprávár, rozpočtár
stavieb

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad
Topľou

Betpres 28 ROKOV STAVIAME NA HODNOTÁCH

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 23 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:26.07.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Oprava poškodenej strešnej krytiny***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na požiadavku projektanta boli spracované práce na opravu poškodenej strešnej krytiny, čo nebolo obsiahnuté v PD.

Práce boli zrealizované na základe vizuálnej obhliadsky.

viď.fotodokumentácia

Oznámil: Dátum: **26.07.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:23**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:* st.dozor
Od: *From:* **BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698 Vranov nad Topľou*
Dátum:**26.07.2022** *Date:*

Odoslané: *Sent by:* Kurier: *Courier:* ____ Fax: *Fax:* ____ Osobne: **mailom** *Hand:* ____

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.23
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***3 057,94*** **€ bez DPH**

Pripravil :
OTÚ Betpres
Dátum **26.07.2022**
Date:


Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:


Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.23: ***3 057,94*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 201 057,94 € bez DPH**

Schválil:
generálny projektant
Dátum:
Date:

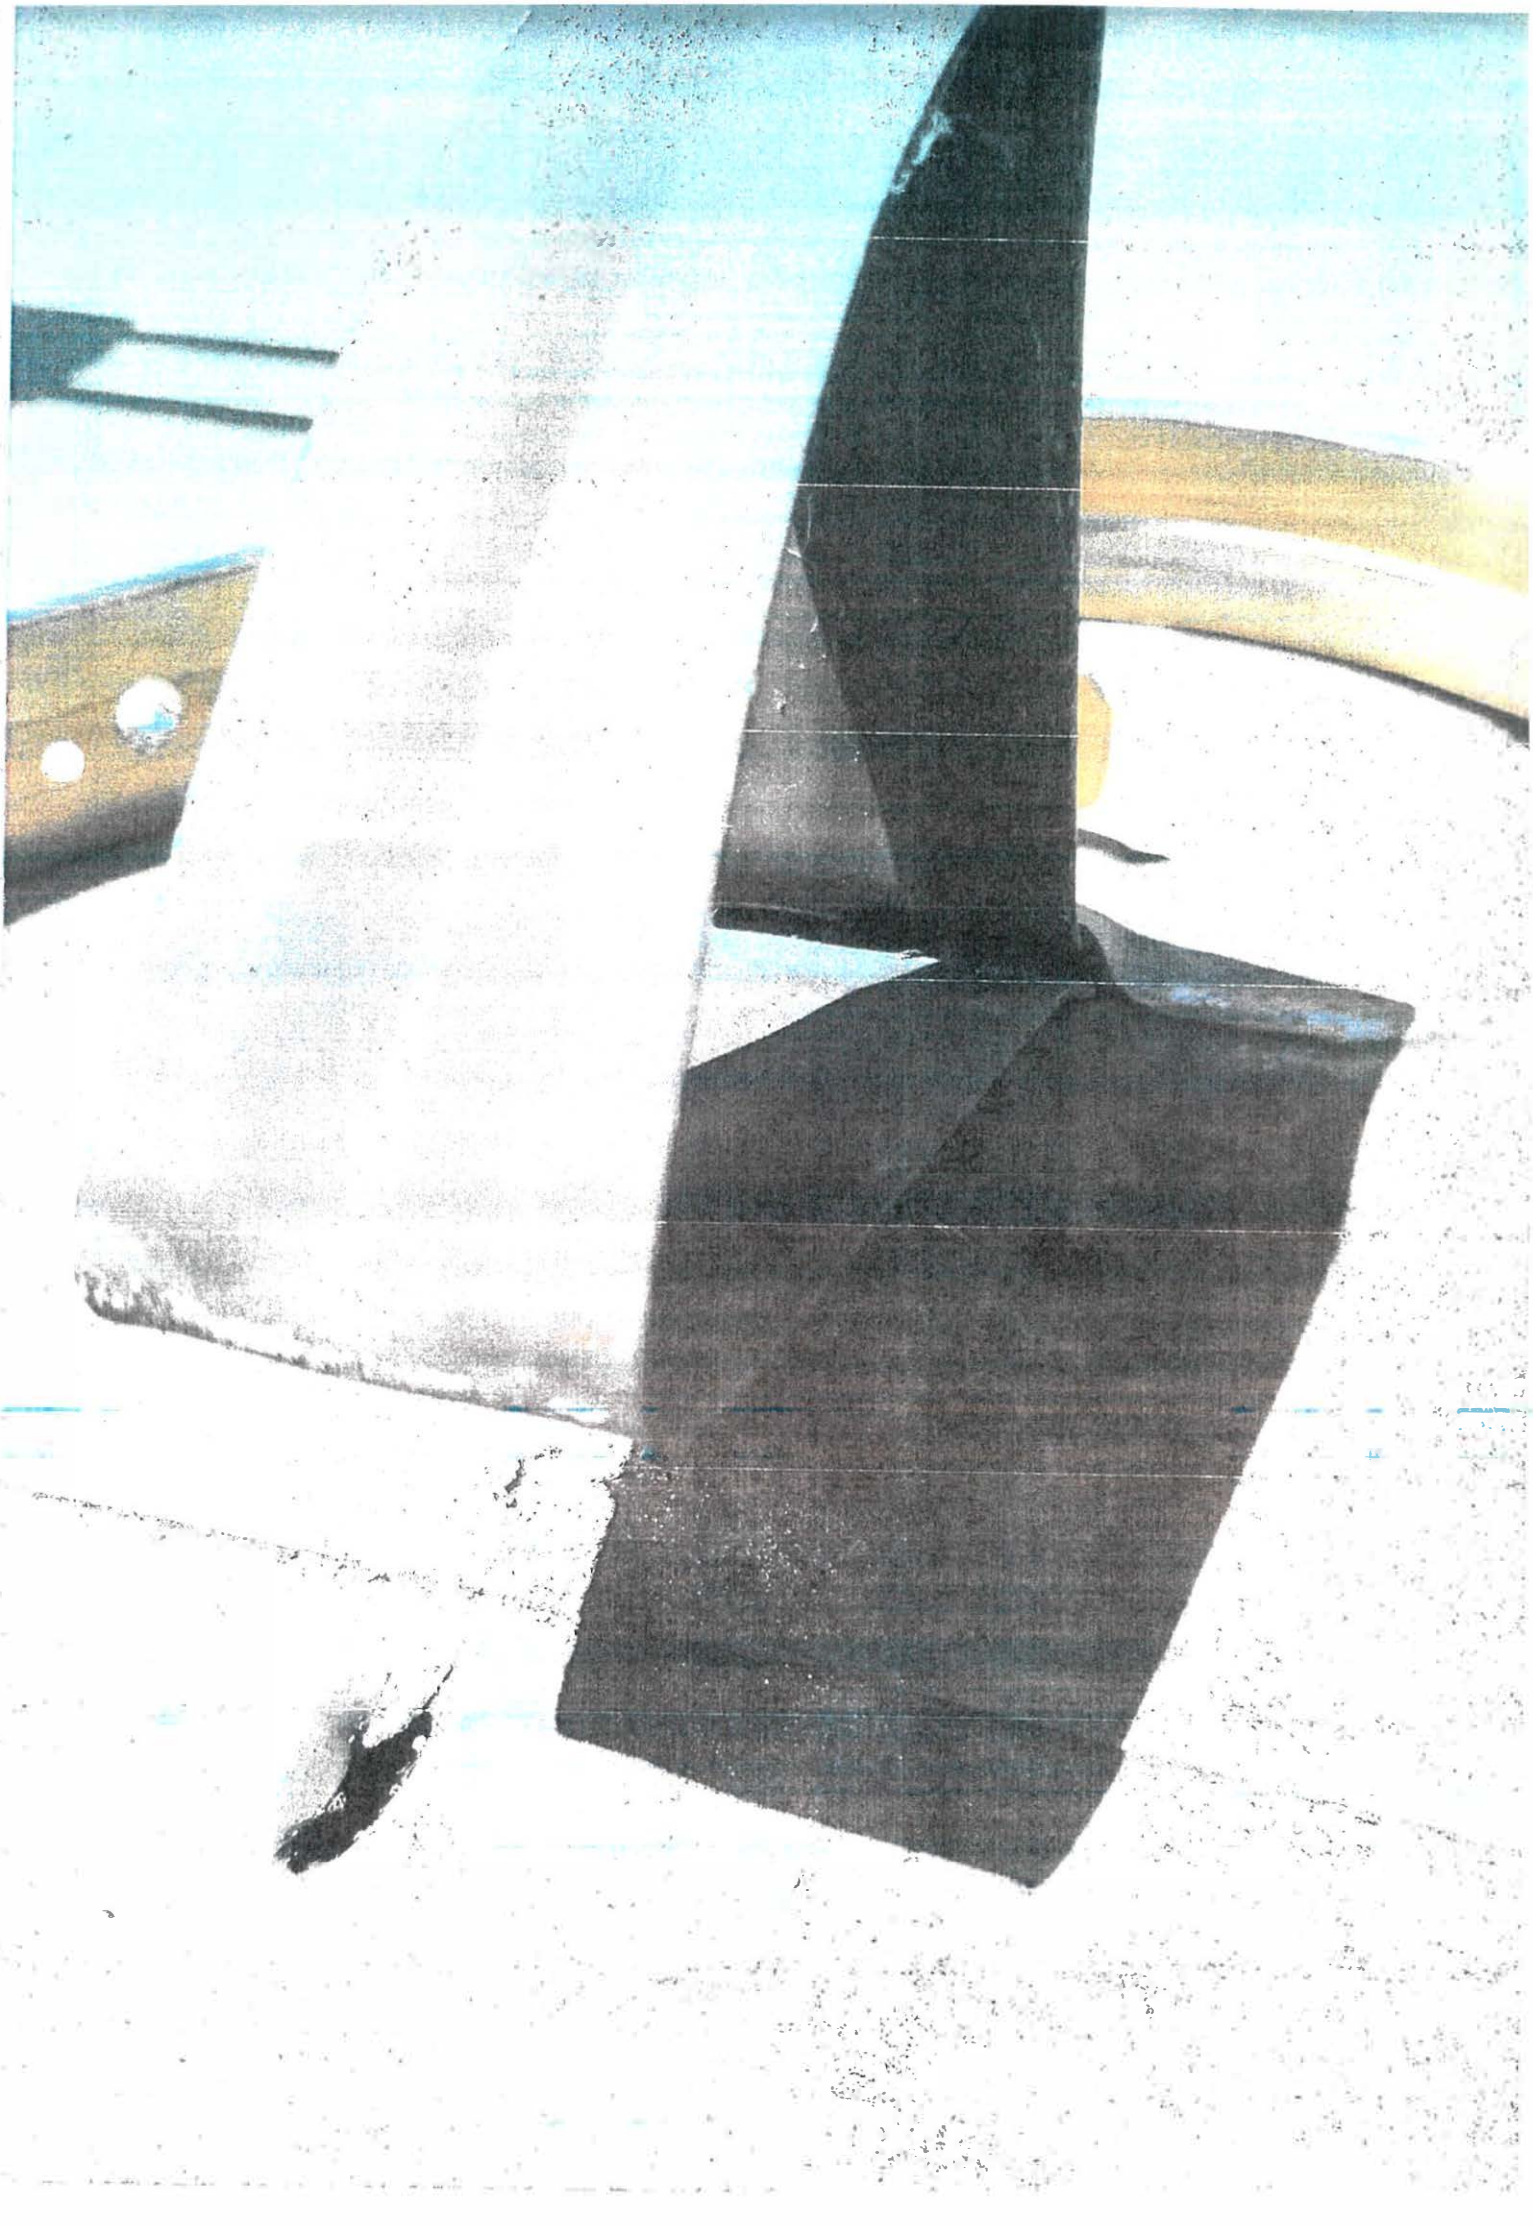

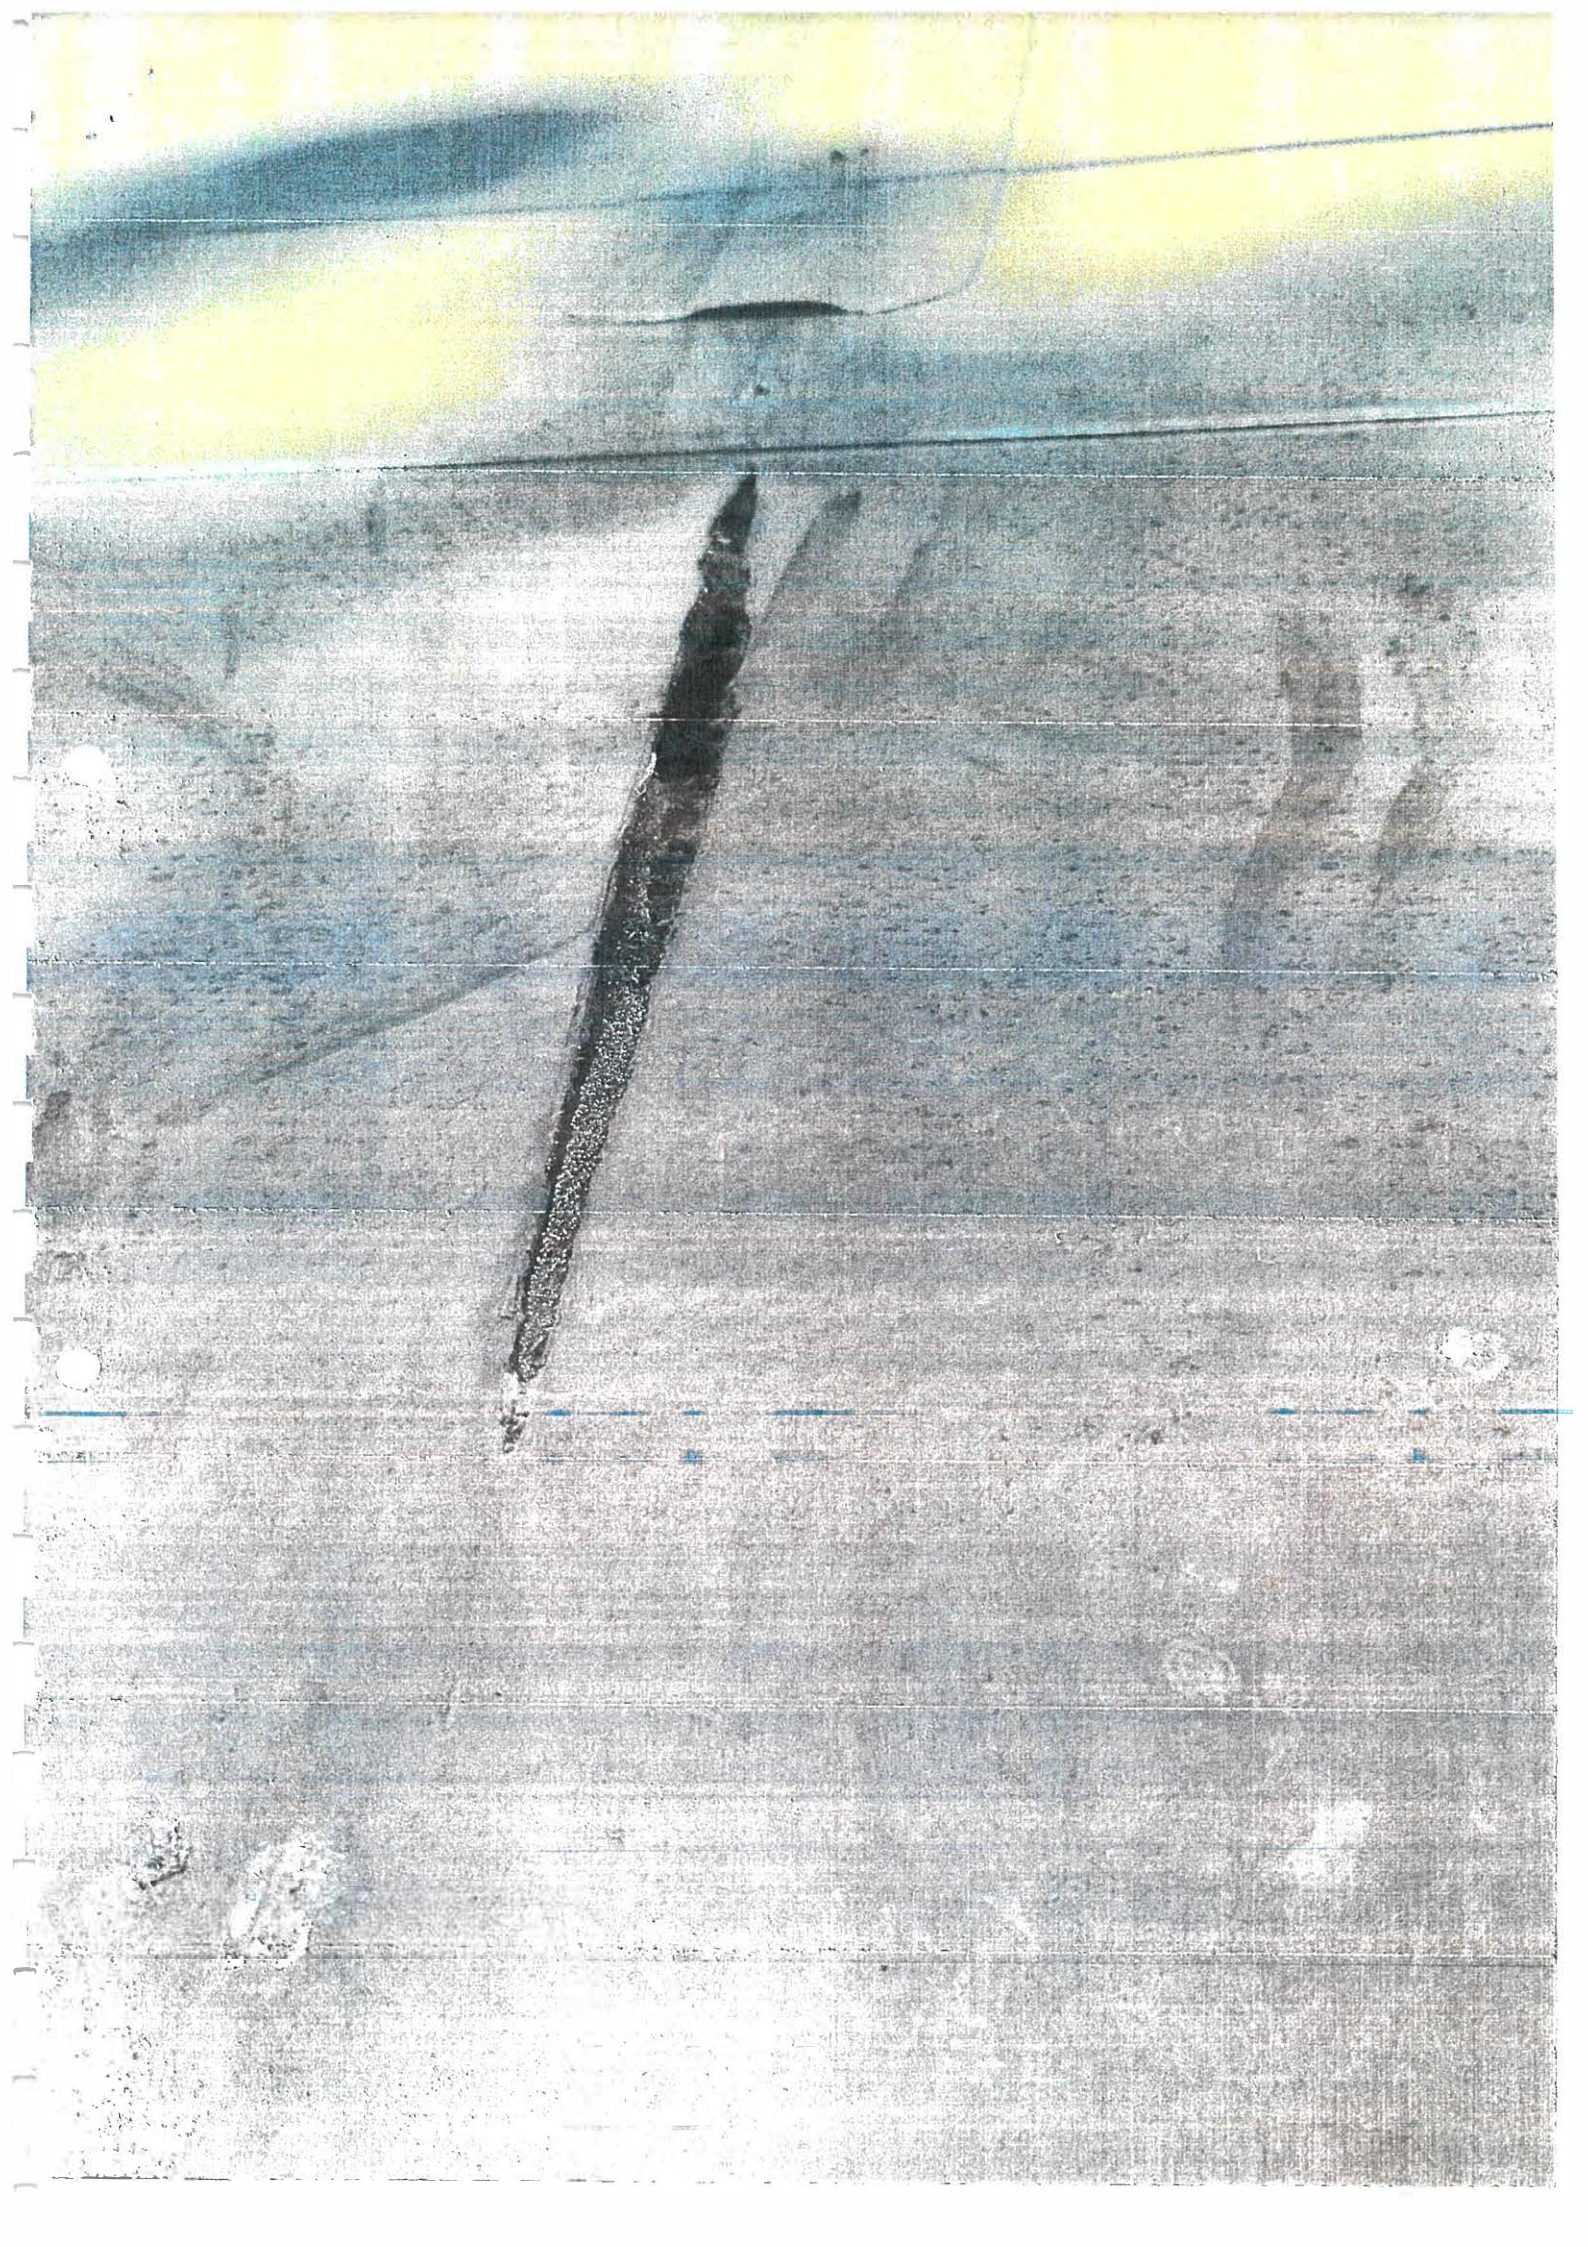

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.23 Poškodenie strešného plášťa Cenkros	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	26.07.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 716,52	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 341,42	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 057,94	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22	3 057,94
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 3 057,94	611,59
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**3 669,53**
		E	**Prípočty a odpočty**	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis				

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.23 Poškodenie strešného plášťa Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 26. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**HSV**				**3 057,94**	**0,168**
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**1 765,12**	**0,087**
1	764248914.S	Ostatné prvky kusové z medeného Cu plechu.oprava a dodávka snehových zábran /strbnutých/	ks	64,000	27,58	1 765,12	0,087
	712	**Izolácie striech, povlakové krytiny**				**1 292,82**	**0,081**
2	712670020.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m2	30,000	15,09	452,70	0,016
3	*283220002100*	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba medená*	*m2*	*34,500*	*6,96*	*240,12*	*0,066*
4	pc 23-1	Použitie plošiny	hod	24,000	25,00	600,00	0,000
		Celkom				**3 057,94**	**0,168**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 22 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:10.08.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Dopojenie ELI k tieneniu***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na požiadavku projektanta boli spracované práce na dopojenie elektroinštalácie k okenému tieneniu, čo nebolo obsiahnuté v PD.

Práce boli naprojektované ako poredpríprava k montáži tieniacich vnútorných žalúzií.

viď.PD

Oznámil: Dátum: **10.08.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:22**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:	**10.08.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* _____	*Hand:* _____		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.22
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***1 438,14*** **€ bez DPH**

Pripravil :
OTÚ Betpres
Dátum **10.08.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.20: ***1 438,14*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 199 438,14 € bez DPH**

Schválil:
generálny projektant
Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.22 Tienenie dopojenie ELI	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.07.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 775,52	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž 662,62	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 438,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 438,14
24	DPH 20,00 % z 1 438,14	287,63
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 725,77**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.22 Tienenie dopojenie ELI

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 12. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	M	**Práce a dodávky M**		**1,000**	**1 438,14**	**1 438,14**	**0,000**
	B	**Káble a vodiče**		**1,000**	**1 208,30**	**1 208,30**	**0,000**
1	210881233.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	280,000	1,09	305,20	0,000
2	*KPE000000676*	*Kábel pevný CHKE-R-J 5x2,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový*	*m*	*280,000*	*1,99*	*557,20*	*0,000*
3	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	2,000	1,34	2,68	0,000
4	*345410008700.S*	*Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF*	*ks*	*2,000*	*0,12*	*0,24*	*0,000*
5	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	24,000	9,96	239,04	0,000
6	*345410013000.S*	*Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66*	*ks*	*24,000*	*2,38*	*57,12*	*0,000*
7	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia	ks	2,000	2,81	5,62	0,000
8	*345330003530.S*	*Prepínač žaluziový polozapustený a zapustený*	*ks*	*2,000*	*19,70*	*39,40*	*0,000*
9	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*2,000*	*0,90*	*1,80*	*0,000*
	C4	**Káblové žľaby, chráničky**		**1,000**	**229,84**	**229,84**	**0,000**
10		Rúrka ohybná elektroinštalačná D20 uložená pevne	m	64,000	1,72	110,08	0,000
11		*Rúrka ohybná D20 uchytená pevne*	*m*	*64,000*	*0,84*	*53,76*	*0,000*
12	*Pol4*	*Wago zaklapovacie*	*ks*	*120,000*	*0,55*	*66,00*	*0,000*
		Celkom				**1 438,14**	**0,000**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.22 Tienenie dopojenie ELI	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.07.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.		Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	775,52
2		Montáž	662,62
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 438,14
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ 10.8.2022

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 438,14
24	DPH 20,00 % z 1 438,14	287,63
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 725,77**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenia - -	0,00

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 21 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:12.07.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ___ Fax: ___ Hand: ____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Oplechovanie záveternej lišty***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref.:*

POPIS ZMENY:

1 . Na požiadavku KPU ing.Mokriša boli spracované práce na medené oplechovanie záveterných líšt severnej a južnej strany fasady .

viď.zápis KPU

Oznámil: Dátum: **12.07.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:21**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:	**12.07.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* _____	*Hand:* _____		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.21
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***8 345,60*** **€ bez DPH**

Pripravil:
OTÚ Betpres
Dátum:
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.20: ***8 345,60*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 206 345,60 € bez DPH**

Schválil:
generálny projektant
Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.21 Oplechovanie záveternej lišty Cu	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČDPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	11.07.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	5 150,40
4		Montáž	3 195,20
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 345,60
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 345,60
24	DPH 20,00 % z 8 345,60	1 669,12
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 014,72**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.21 Oplechovanie záveternej lišty Cu

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 11. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**8 345,60**	**0,292**
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**8 345,60**	**0,292**
1	764321820.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	80,000	1,16	92,80	0,000
2	764291240.S	Záveterná lišta z medeného Cu plechu,	m	80,000	74,56	5 964,80	0,250
3	764294940.S	Ostatné prvky strešné z medeného plechu, príponka z plochej medi na uchytenie lemovania	ks	160,000	14,30	2 288,00	0,042
		Celkom				**8 345,60**	**0,292**

- JE VHODNÉ PRERUŠIŤ VZLÍNAJÚCU VLHKOSŤ IZOLAČNOU VRSTVOU. KOTVENIE DO MURIVA JE HODNÉ POSILNIŤ VRUTMI.

3. OPLECHOVANIE STRECHY ZO SEVERNEJ POHĽADOVEJ STRANY BUDE VYMENENÉ ZO SÚČASNÉHO PLECHU NA MEĎ.

4. KPÚ ODPORÚČA PARAPETY PODOZRIŤ DILATÁCIOU A UROBIŤ VÄČŠIE ULOŽENIE MEDENÝCH OPLECHOVANÍ PARAPETOV OKIEN, ABY NEDOCHÁDZALO K ZNEČISŤOVANIU OMIETKY MEDIENKOU.

5. PROJEKTANT MÁ PREDLOŽIŤ NA KPÚ DETAIL STRIEŠKY NAD SEVERNÝM VSTUPOM. DETAIL Č. 1 - MARKÍZA NAD VSTUPOM NIE JE DOSTATOČNE PODROBNÝ. (Špirálová)

6. KPÚ UPOZORŇUJE NA POVINNOSŤ PROJEKTANTA DOLOŽIŤ KLADAČSKÝ VÝKRES DLAŽIEB V INTERIÉRI NKP.

7. KPÚ ODPORÚČA ARCHITEKTONICKY RIEŠIŤ (PÁSMI OMIETKY) PRÍSTAVKY NKP NA VÝCHODNEJ STRANE OBJEKTU.

ZAPÍSAL:

PRÍTOMNÝ

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 20 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:17.06.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Zmena materiálu palubovej podlahy***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref.:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref.:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref.:*

POPIS ZMENY:

1 . Na požiadavku investora a projektanta boli spracované práce na zmenu materiálu palubovej podlahy a doplnenie plochy o farebné čiarovanie celkový náter plochy.

Oznámil: Dátum: **17.06.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:20**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:	**17.06.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* _____	*Hand:* _____		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.20
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***25 024,20*** **€ bez DPH**

Pripravil :
OTÚ Betpres
Dátum 17.06.2022
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.20: ***25 024,20*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 223 024,20 € bez DPH**

Schválil:
generálny projektant
Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**	JKSO	
Názov objektu	**ZK č.20 Zmena materiálu podlahy a čiarovanie**	EČO	
Názov časti	**Typ podlahy Grabo jasen**	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	07.06.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	25 024,20
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 024,20
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	25 024,20
24	DPH 20,00 % z 25 024,20	5 004,84
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**30 029,04**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.20 Zmena materiálu podlahy a čiarovanie
Časť: Typ podlahy Grabo jasen

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 7. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**25 024,20**	**0,000**
	775	**Podlahy vlysové a parketové**				**25 024,20**	**0,000**
1	pc 01	Čiarovanie	bm	564,000	3,24	1 827,36	0,000
2	pc02	Farebné rozlíšenie hracích plôch	m2	244,840	19,15	4 688,69	0,000
3	pc03	Doplatok za typ parkety Grabo,dezén jasen natur	m2	985,000	2,40	2 364,00	0,000
4	pc 04	Lakovanie celej hracej plochy	m2	985,000	16,39	16 144,15	0,000
		Celkom				**25 024,20**	**0,000**

Dobrý deň,
Za Objednávateľa potvrdzujem výber palubovej podlahy „Jaseň“

S pozdravom

referát výstavby
Odd. strategického rozvoja
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 19 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:07.06.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: ____

Predmet zmeny: *Subject:* ***ZTI***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Prace boli spracované a zrealizované podľa projektu ZTI ako doplnenie podľa odsúhlaseniast.dozora.

Oznámil: Dátum: **07.06.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:19**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:**07.06.2022**	
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* _____	*Hand:* _____		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.19
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***2 500,04*** **€ bez DPH**

Pripravil :
OTÚ Betpres
Dátum 07.06.2022
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.19: ***2 500,04*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 200 500,04 € bez DPH**

Schválil:
generálny projektant
Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angeis Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.19 ZTI	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	02.06.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	48,40	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	29,12	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	2 422,52	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 500,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 500,04
24	DPH 20,00 % z 2 500,04	500,01
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**3 000,05**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.19 ZTI

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 2. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**77,52**	**0,000**
8		**Rúrové vedenie**				**77,52**	**0,000**
1	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 90	m	4,000	1,84	7,36	0,000
2	*2861D0207*	*Potrubie vodovodné HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 - 90x8,2*	*m*	*4,000*	*12,10*	*48,40*	*0,000*
3	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	4,000	0,70	2,80	0,000
4	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	4,000	4,74	18,96	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**2 422,52**	**0,000**
721		**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**2 380,76**	**0,000**
8	721173401	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	16,000	17,76	284,16	0,000
9	721173403	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	18,000	21,97	395,46	0,000
7	721175111	Potrubie kanalizačné z PP,zvislé zvuk tlmiace viacvrstvové DN 75	m	3,000	34,77	104,31	0,000
5	721175121	Potrubie kanalizačné z PP, ležaté zvuk tlmiace viacvrstvové DN 75	m	22,000	37,00	814,00	0,000
6	721175122	Potrubie kanalizačné z PP, ležaté zvuk tlmiace viacvrstvové DN 110	m	20,000	38,83	776,60	0,000
10	998721103	Presun hmôt pre vnút.kanalizáciu v objektoch výšky do 24m	t	0,245	25,42	6,23	0,000
722		**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**41,76**	**0,000**
11	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150, vrátane dodávky vodiča	m	13,000	1,50	19,50	0,000
12	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	1,000	4,26	4,26	0,000
13	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp, vrátane dodávky fólie	m	12,000	1,50	18,00	0,000
		Celkom				**2 500,04**	**0,000**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 18 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice, Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o.** **Dátum:08.09.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ___ Fax: ___ Hand: ____

Predmet zmeny: *Subject:* ***ASR severna tribuna nová úprava schodníc***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na návrh projektanta a jeho odsúhlasenia boli spracované práce na úpravu schodníc severnej tribuny zmenou projektového riešenia,ktorý uvažoval schodnice doplniť oceľovým plechom.

Práce zrealizované podľa doplnenej PD a VV.

Oznámil: Dátum: **08.09.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:18**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:**08.09.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*
			Vranov nad Topľou	
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**	
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* ____	*Hand:* ____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.18
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***43 175,63*** **€ bez DPH**


Pripravil :
OTÚ Betpres
Dátum **08.09.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela:	**2 198 000,00**	**€ bez DPH**
Navrhovaná zmena č.18:	***43 175,63***	**€ bez DPH**
Doporučená cena diela :	**2 241 175,63**	**€ bez DPH**

Schválil: **Ceving**
Dátum:
Date:

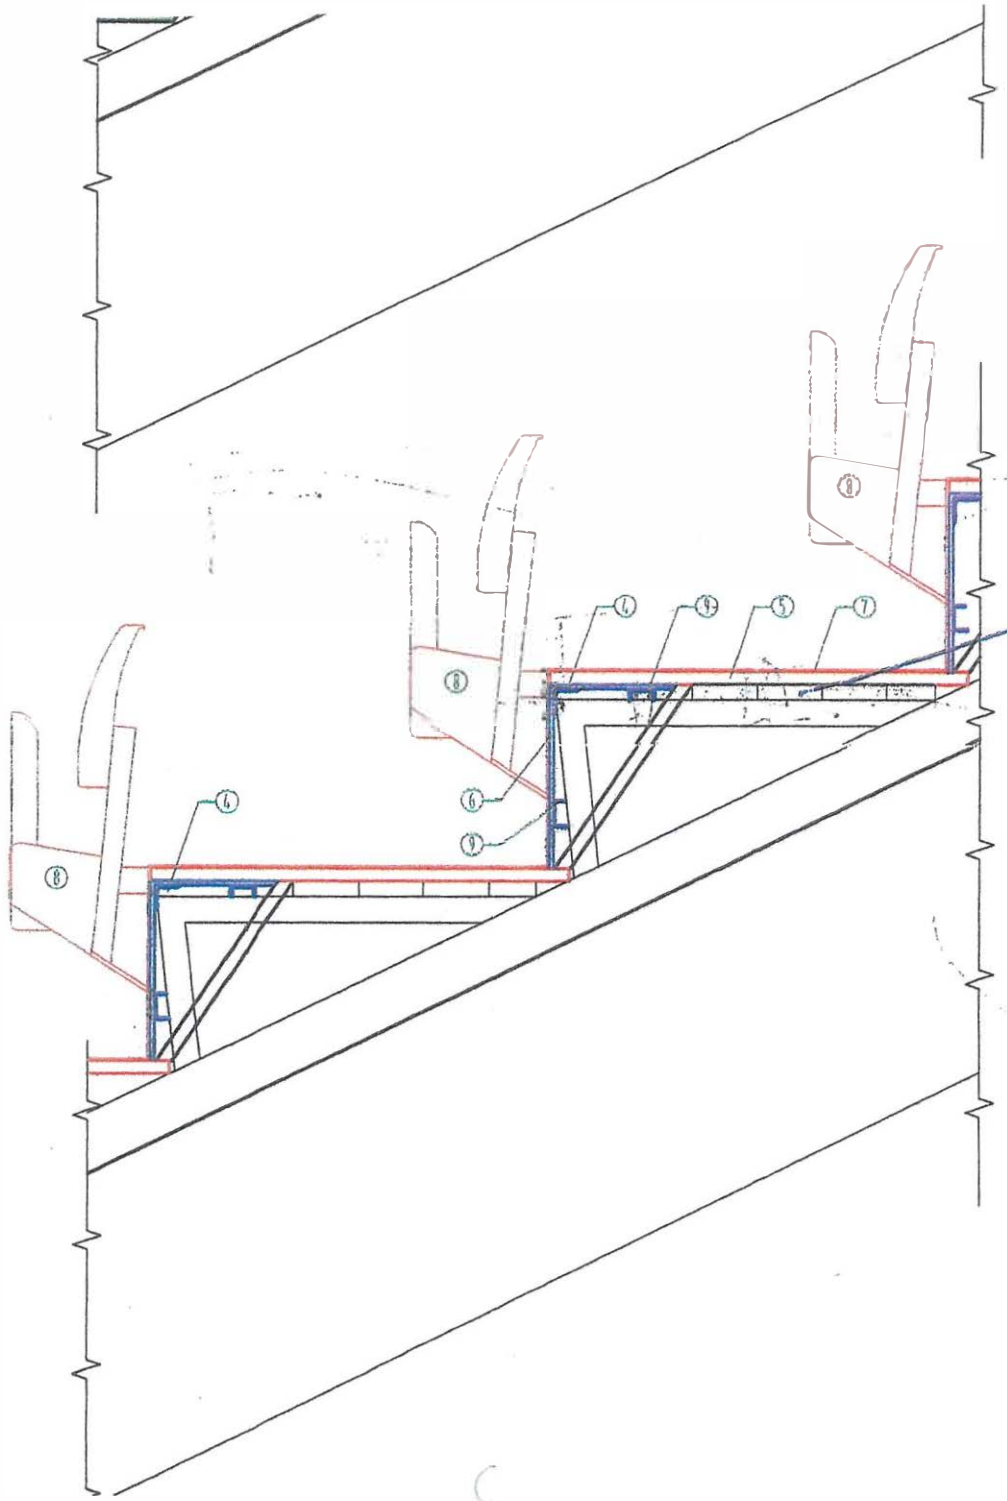

POZNÁMKY:

-ROZMERY JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ U
-PRI VÝZMANNEJ ODCHYLKE EXISTUJÚCEH
KONZULTOVAŤ TÚTO SKUTOČNOSŤ S PRO.
- OBKOPAŤ A ZAIZOLOVAŤ BUDOVU PO CE

1. EXISTUJÚCI KOVOVÝ ZAHNUTÝ
2. EXISTUJÚCU PODLAHOVÉ DREVC
3. EXISTUJÚCU LAVICU DREVENÚ A
4. NAVRHOVANÝ OCEĽOVÝ PROFIL
5. NOVÁ OSB DOSKA HR. 25 MM
6. OCEĽOVÝ PLECH STUŽUJÚCI
7. PVC PODLAHOVINA
8. SEDADLO
9. VYROVNÁVAJÚCI PLECH/PROFIL

FOSNE SA MUSIA DYTZ

BÚRANÉ, ASANOVANÉ

NOVÉ KONŠTRUKCIE

±0,000 = 209,43 m n. m.

REVČ./REVNO:	DÁTUM / DATE:	
1.		
2.		
3.		

AUTOR NÁVRHU / AUTHOR PROPOSAL:

GENERÁLNY PROJ. / GENERAL ENGINEER: CEVI

KONTROLOVAL/ CHKD BY:

ZODPOV. PROJ. / RESPONSIBLE ENG:

PROJEKTANT / MADE BY:

INVESTOR / CLIENT: Mesto Košice, Trieda SNP 48

MIESTO STAVBY / SITE: p.č. 265/1; k.ú.: Stredné Mesto

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

STAVEBNÝ OBJEKT / BUILDING UNIT:

NÁZOV VÝKRESU / TITLE DRWG.

DETAILO

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.18 Schodnice severnej tribuny	EČO	
Názov časti	Schodnice severnej tribuny Cenkros	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	09.06.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	26471,14	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	17 249,62	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		43 720,76	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	43 720,76
24	DPH 20,00 % z 43 720,76	8 744,15
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**52 464,91**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Dátum: 3.3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-t	ZK č.18 Schodnice severnej tribuny	43 175,63	8 635,13	51 810,76	0,00	43175,63	0,00	0,00	0,00
u-1	Schodnice severnej tribuny ŽoD	18 839,87	3 767,97	22 607,84	0,00	18 839,87	0,00	0,00	0,00
u-2	Schodnice severnej tribuny Cenkros	43 720,76	8 744,15	52 464,91	0,00	43 720,76	0,00	0,00	0,00
u-3	Schodnice severnej tribuny menej práce	-19 385,00	-3 877,00	-23 262,00	0,00	-19 385,00	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**43175,63**	**8635,13**	**51 810,76**	**0,00**	**43 175,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.18 Schodnice severnej tribuny	EČO	
Názov časti	Schodnice severnej tribuny ZoD	Miesto	Košice
		IČO	iČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	09.06.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	597,92
3	PSV	Dodávky	5 469,45
4		Montáž	12 772,50
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 839,87
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	18 839,87
24	DPH 20,00 % z 18 839,87	3 767,97
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**22 607,84**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.18 Schodnice severnej tribuny
Časť: Schodnice severnej tribuny ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 9. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	M.j	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**597,92**	**0,000**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**597,92**	**0,000**
1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,100	3,39	81,70	0,000
2	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	241,000	0,27	65,07	0,000
3	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,100	2,19	52,78	0,000
4	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	24,100	3,53	85,07	0,000
5	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	24,100	13,00	313,30	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**18 241,95**	**1,593**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**9 378,60**	**0,000**
16	767995395.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 4	kg	4 785,000	1,96	9 378,60	0,000
	776	**Podlahy povlakové**				**8 863,35**	**1,593**
9	250020001.S	Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou úpravou (pred nalepením PVC)	m2	410,000	1,22	500,20	0,000
10	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch s vytiahnutím	m2	410,000	6,50	2 665,00	0,000
11	*284110000100*	*Podlaha PVC heterogénna A, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43,*	*m2*	*492,000*	*9,50*	*4 674,00*	*1,525*
12	*247440001300.S*	*Lepidlo DEN BRAVEN HYBRI FLOOR L8400 elastické na podlahy pre PVC a kaučukové podlahoviny, alebo ekvivalent*	*kg*	*150,000*	*2,50*	*375,00*	*0,000*
13	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	410,000	0,72	295,20	0,033
14	*585520013600*	*Penetrácia na nové podklady pod PVC*	*kg*	*35,000*	*5,57*	*194,95*	*0,035*
15	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,590	100,00	159,00	0,000
		Celkom				**18 839,87**	**1,593**

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.18 Schodnice severnej tribuny
Časť: Schodnice severnej tribuny Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 9. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**43 720,76**	**9,524**
	762	**Konštrukcie tesárske**				**23 818,07**	**4,673**
1	762512245.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	410,000	7,57	3 103,70	0,000
2	762512245.S-1	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním na schody	m2	70,000	15,13	1 059,10	0,000
3	762512245.S-2	Doplnenie nerovností podložením	kpl	1,000	9 329,10	9 329,10	0,000
4	*607260000400.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*480,000*	*18,92*	*9 081,60*	*4,646*
5	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0,03000 t dosky-celoplošné debnenie pod polč.43	m2	241,000	5,00	1 205,00	0,000
11	762595000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	10,250	3,86	39,57	0,027
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**18 383,04**	**4,811**
7	*145540000900.S*	*Profily oceľové podľa výpisu v prílohe*	*t*	*4,785*	*3 528,00*	*16 881,48*	*4,785*
10	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	528,000	1,77	934,56	0,026
9	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	450,000	1,26	567,00	0,000
	783	**Nátery**				**1 519,65**	**0,040**
12	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	247,500	6.14	1 519,65	0,040
		Celkom				**43 720,76**	**9,524**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.18 Schodnice severnej tribuny	EČO	
Názov časti	Schodnice severnej tribuny menej práce	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	05.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-19 385,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r.1-6)		-19 385,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	-19 385,00
24	DPH 20,00 % z -19 385,00	-3 877,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-23 262,00**

E	Pripočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.18 Schodnice severnej tribuny
Časť: Schodnice severnej tribuny menej práce

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 5. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**-19 385,00**	**-0,078**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**-19 385,00**	**-0,078**
1	*552380012900*	*ZK5 doplnenie oceloveho plechu plech hr. 8 mm + PVC vid PD*	*m*	*-204,440*	*94,82*	*-19 385,00*	*-0,078*
		Celkom				**-19 385,00**	**-0,078**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE*** — **OZNÁMENIE : č. 17** / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o.** **Dátum:02.06.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ___ Courier: ___ Fax: ___ Hand: ___

Predmet zmeny: *Subject:* ***ASR severna stena okna***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na návrh projektanta boli spracované práce na doplnenie pohladovej plochy ZB nosnikov sadrokartonom a zámeny priehľadného skla za neprihľadné podľa odsúhlasenia a projektanta.

viď. Zápis KPU

Oznámil: Dátum: **02.06.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:17**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:**02.06.2022**	
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* _____	*Hand:* _____		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.17
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***2 097,79*** **€ bez DPH**

Pripravil :
OTÚ Betpres
Dátum **02.06.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**
Navrhovaná zmena č.17: ***2 097,79*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 200 097,79 € bez DPH**

Schválil: **Ceving**
Dátum:
Date:

KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
KOŠICE

Záznam

ZO ZISTENIA NA MIESTE SAMOM, NA OBNOVE UCP JAZDIAREŇ /ANGELS ARÉNA, HVIEZDOSLÁVOVA 8, NA PARCELE Č. 265/1, Č. ÚZPF 12238/8, VO VLASTNÍCTVE MESTA KOŠICE

spísaný v KOŠICIACH dňa 02.06.2022

Prítomní: za KPÚ Košice : .....

.....

vlastník, správca: .....

.....

ostatní prítomní: BETPRES, STAVBYVEDÚCI

.....

.....

Predmet rokovania, zá very:

KPÚ UROBIL OBHLIADKU STAVBY. AKTUÁLNE SÚ REALIZOVANÉ VONKAJŠIE PLOCHY ZÁPADNEJ FASÁDY, SEVER JE ZAČATÝ.

a) - BODOVÉ CHEMICKÉ KOTVY NA FIXOVANIE PÔVODNEJ OMIETKY

b) - SANAČNÝ PROGRAM SOCLOVEJ ČASTI

c) - VYSPRAVENIE OPADNUTÝCH ČASTÍ JADROVEJ OMIETKY

d) - FINÁLNA ÚPRAVA STIERKOU - PAMIATKÁRSKY PROGRAM

1. KPÚ ODPORÚČA REALIZOVAŤ OSTREJŠIE HRANY NÁROŽÍ PILIEROV
2. PLOCHY SADROKARTÓNOVÝCH STIEN ZA HORNOU PLOCHOU SVETLÍKA OKIEN NATRIEŤ SIVOU FARBOU.

O JE VHODNÉ PRERUŠIŤ VZLÍNAJÚCU VLHKOSŤ IZOLAČNOU VRSTVOU. KOTVENIE DO MURIVA JE HODNÉ POSILNIŤ VRUTMI.

3. OPLECHOVANIE STRECHY ZO SEVERNEJ POHLADOVEJ STRANY BUDE VYMENENÉ ZO SÚČASNÉHO PLECHU NA MEĎ.

4. KPÚ ODPORÚČA PARAPETY PODOZRIŤ DILATÁCIOU A UROBIŤ VÄČŠIE ULOŽENIE MEDENÝCH OPLECHOVANÍ PARAPETOV OKIEN, ABY NEDOCHÁDZALO K ZNEČISŤOVANIU OMIETKY MEDIENKOU.

5. PROJEKTANT MÁ PREROKOVAŤ NA KPÚ DETAIL STRIEŠKY NAD SEVERNÝM VSTUPOM. DETAIL Č. 1 - MARKÍZA NAD VSTUPOM NIE JE DOSTATOČNE PODROBNÝ.

6. KPÚ UPOZORŇUJE NA POVINNOSŤ PROJEKTANTA DOLOŽIŤ KLADAČSKÝ VÝKRES DLAŽIEB V INTERIÉRI NKP.

7. KPÚ ODPORÚČA ARCHITEKTONICKY RIEŠIŤ (PÍSOMNE OMIETKY) PRÍSTAVOK NKP NA VÝCHODNEJ STRANE OBJEKTU.

ZAPÍSAL:

PRÍTOMNÝ:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.17 ASR Okna severná stena	EČO	
Názov časti	ASR Okna severná stena Cenkros	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	02.06.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	284,32	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 813,47	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 097,79	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 097,79
24	DPH 20,00 % z 2 097,79	419,56
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 517,35**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.17 ASR Okna severná stena
Časť: ASR Okna severná stena Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 2. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**2 097,79**	**0,310**
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**897,79**	**0,310**
1	763147111.S pc1	Lepenie SDK dosky - vrchná časť okien Severná fasáda hr. , doska štandardná 12,5 mm 1,6x1,0m*6ks	m2	9,600	25,35	243,36	0,133
2	763147111.S pc2	Konštrukcia - kastlík - vrchná časť okien Severná fasáda - zvislo, doska štandardná 12,5 mm 1,6*1,0*4ks - zvislo	m2	6,400	48,75	312,00	0,089
3	763147111.S pc3	Konštrukcia - kastlík - vrchná časť okien Severná fasáda - vodorovne, doska štandardná 12,5 mm ,0,35*1,6m*4ks	m	6,400	51,35	328,64	0,089
4	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	8,840	1,56	13,79	0,000
	787	**Zasklievanie**				**1 200,00**	**0,000**
5	787991211.S pc	Doplatok za výmenu zasklenia okien na severnej strane z priehľadného skla na nepriehľadné Parsol	ks	10,000	120,00	1 200,00	0,000
		Celkom				**2 097,79**	**0,310**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 16 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:09.06.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ *Courier:* ____ *Fax:* ___ *Hand:* ____

Predmet zmeny: ***Doplnenie rozvádzača DPMK,EPS rozvody k turniketom***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na návrh prjektanata bola spracovaná ponuka na predmetné prace nakoľko neboli súčasťou projetovej dokumentácií.

Práce boli naprojektované ako predpríprava k montáži turniketov.

viď.doplňujuca PD

Oznámil: Dátum: **09.06.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:16**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:**01.07.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*
			Vranov nad Topľou	
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**	
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* _____	*Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.116
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***905,58*** **€ bez DPH**

Pripravil :
OTÚ Betpres
Dátum **09.06.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**
Navrhovaná zmena č.14: ***905,58*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 198 905,58 € bez DPH**

Schválil: **Ceving,**
Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.16 Skrina DPMK a EPS rozvody k turniketom	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	25.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	89,50
2		Montáž	83,10
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	409,31
6		Montáž	143,67
7	ZRN (r. 1-6)		725,58
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		180,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	905,58
24	DPH 20,00 % z 905,58	181,12
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 086,70**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-r	ZK č.16 Skrina DPMK a EPS rozvody k turniketom	905,58	181,12	1 086,70	180,00	725,58	0,00	0,00	0,00
r-1	Doplnenie rozvádzača DPMK	425,18	85,04	510,22	180,00	245,18	0,00	0,00	0,00
r-2-a	EPS rozvody k turniketom ZOD	50,30	10,06	60,36	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00
r-2-b	EPS rozvody k turniketom Cenkros	257,50	51,50	309,00	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00
r-3-a	Rozvody ŠK k turniketom ZoD	151,60	30,32	181,92	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00
r-3-b	Rozvody ŠK k turniketom Cenkros	21,00	4,20	25,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**905,58**	**181,12**	**1 086,70**	**180,00**	**725,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.16 Skrina DPMK a EPS rozvody k turniketom	EČO	
Názov časti	Doplnenie rozvádzača DPMK	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	25.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	165,11
6		Montáž	80,07
7	ZRN (r. 1-6)		245,18
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		180,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	425,18
24	DPH 20,00 % z 425,18	85,04
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**510,22**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.16 Skrina DPMK a EPS rozvody k turniketom
Časť: Doplnenie rozvádzača DPMK

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		**Práce a dodávky M**				**425,18**	**0,025**
21-M		**Elektromontáže**				**245,18**	**0,025**
1	210101603.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 50-70 mm2	ks	2,000	21,06	42,12	0,000
2	*345820000400.S*	*Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 25-70 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*50,08*	*100,16*	*0,002*
3	210902216	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50 pre vonkajšie práce	m	15,000	2,53	37,95	0,000
4	*341110030700.S*	*Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm2*	*m*	*15,000*	*4,33*	*64,95*	*0,023*
HZS		**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**180,00**	**0,000**
5	HZS000112.S	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	2,000	35,00	70,00	0,000
6		úprava v rozvádzači RE - požiadavka DPMK	hod	2,000	55,00	110,00	0,000
		Celkom				**425,18**	**0,025**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.16 Skrina DPMK a EPS rozvody k turniketom	EČO	
Názov časti	EPS rozvody k turniketom ZOD	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	25.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 27,20				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 23,10				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	50,30	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	50,30
24	DPH 20,00 % z 50,30	10,06
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**60,36**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.16 Skrina DPMK a EPS rozvody k turniketom
Časť: EPS rozvody k turniketom ZOD

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	22-M	**Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení**				**50,30**	**0,000**
	M	**Práce a dodávky M**				**50,30**	**0,000**
3	*Pol32*	*Bezhalogénový kábel JE-H(St)H 2x2x0,8 PS60 B2ca, s1, d1, a1*	*m*	*16,000*	*0,84*	*13,44*	*0,000*
4	*HFX20*	*HFX 20 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C*	*m*	*8,000*	*0,52*	*4,16*	*0,000*
5	*5225ZNF*	*Príchytka TYP OMEGA, pre priem. 24-29mm, oceľ pozink alebo ekvivalent*	*ks*	*10,000*	*0,96*	*9,60*	*0,000*
6	Pol33	Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu	m	2,000	2,20	4,40	0,000
7	Pol36	Natiahnutie kábla, uloženie do rúrky, upevnenie na stropný úchyt	m	16,000	0,70	11,20	0,000
8	Pol37	Natiahnutie a uloženie rúrky ohybnej/pevnej z PVC	m	6,000	1,00	6,00	0,000
9	Pol38	Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 8 mm	ks	10,000	0,15	1,50	0,000
		Celkom				**50,30**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.16 Skrina DPMK a EPS rozvody k turniketom	EČO	
Názov časti	EPS rozvody k turniketom Cenkros	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	25.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 217,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 40,50				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	257,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	257,50
24	DPH 20,00 % z 257,50	51,50
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**309,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.16 Skrina DPMK a EPS rozvody k turniketom
Časť: EPS rozvody k turniketom Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	22-M	**Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení**				**257,50**	**0,000**
	M	**Práce a dodávky M**				**257,50**	**0,000**
1	*IO2034NC*	*Modul 4 x strážený vstup, 4 x relé výstup, v montážnej krabici, biely plast, IP40, protokol 2000*	*ks*	*1,000*	*217,00*	*217,00*	*0,000*
2	Pol24	Montáž a zapojenie I/O modulu	ks	1,000	35,00	35,00	0,000
10	Pol39	Meranie kontinuity káblovej slučky	mer	1,000	5,50	5,50	0,000
		Celkom				**257,50**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.16 Skrina DPMK a EPS rozvody k turniketom	EČO	
Názov časti	Rozvody ŠK k turniketom ZoD	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	25.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	89,50
2		Montáž	62,10
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		151,60
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	151,60
24	DPH 20,00 % z 151,60	30,32
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**181,92**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.16 Skrina DPMK a EPS rozvody k turniketom
Časť: Rozvody ŠK k turniketom ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		**Práce a dodávky M**				**151,60**	**0,000**
22-M		**Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení**				**151,60**	**0,000**
		ŠK - DODÁVKA				**8,80**	**0,000**
1	*KEJ-C6A-S-HD*	*Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KELine, KEJ-C6A-S-HD alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*3,20*	*6,40*	*0,000*
2	*Pol60*	*Krabica univerzálna z PVC KU 68,*	*ks*	*2,000*	*1,20*	*2,40*	*0,000*
		ŠK - MONTÁŽ				**15,00**	**0,000**
4	Pol68	Montáž krabice prístrojovej KU 68	ks	2,000	2,50	5,00	0,000
5	Pol75	Značenie prípojných miest na strane rozvadzača	ks	2,000	1,00	2,00	0,000
6	Pol76	Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu	mer	2,000	4,00	8,00	0,000
Káble		**Káble**				**80,70**	**0,000**
7	*KE550HS23/1E-B2ca*	*KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca-s1, d1, a1 alebo ekvivalent*	*m*	*130,000*	*0,55*	*71,50*	*0,000*
8	*Pol77*	*Rúrka ohybná PVC O25mm, 750 N / 5 cm*	*m*	*20,000*	*0,40*	*8,00*	*0,000*
9	*Pol80*	*Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna*	*ks*	*30,000*	*0,02*	*0,60*	*0,000*
10	*Pol81*	*Páska viazacia 4,8x290mm*	*ks*	*30,000*	*0,02*	*0,60*	*0,000*
		KÁBLOVÉ TRASY - MONT				**47,10**	**0,000**
11	Pol85	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1425, uložená voľne	m	20,000	1,03	20,60	0,000
12	Pol58	Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm	ks	30,000	0,15	4,50	0,000
13	Pol33	Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu	m	10,000	2,20	22,00	0,000
		Celkom				**151,60**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.16 Skrina DPMK a EPS rozvody k turniketom	EČO	
Názov časti	Rozvody ŠK k turniketom Cenkros	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	25.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	21,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21,00
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	21,00
24	DPH 20,00 % z 21,00	4,20
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**25,20**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.16 Skrina DPMK a EPS rozvody k turniketom
Časť: Rozvody ŠK k turniketom Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		**Práce a dodávky M**				**21,00**	**0,000**
22-M		**Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení**				**21,00**	**0,000**
		ŠK - MONTÁŽ				**21,00**	**0,000**
3	Pol67	Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45	ks	2.000	10.50	21.00	0.000
		Celkom				**21,00**	**0,000**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 15 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:1.7.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ___ Fax: ___ Hand: ___

Predmet zmeny: ***Stabilizácia omietok***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na návrh a odporúčanie bola spracovaná ponuka na 1 m2 opravy vonkajších omietok stabilizáciou .

Odsúhlasenie bolo podpísané v SD a zrealizované podľa skutočne vykonaných prác po jednotlivých stenách fasady.

viď.zápis KPU

Oznámil: Dátum: **01.07.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

SH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:15**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:	**01.07.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier: ____*	*Fax: ____*	*Hand: ____*		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.15
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***33 963,79 € bez DPH***

Pripravil :
OTÚ Betpres
Dátum **01.07.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**
Navrhovaná zmena č.14: ***33 963,79 € bez DPH***
Doporučená cena diela : **2 231 963,79 € bez DPH**

Schválil: **Ceving,**
Dátum:
Date:

KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
KOŠICE

Záznam

Zo zistenia na mieste samom, na obnove NKP jazdiareň / Angels aréna, Hviezdoslavova 8, na parcele č. 865/1, č. ÚZPF 1223&/8, vo vlastníctve mesta Košice

spísaný v Košiciach dňa 02.06.2022.

Prítomní: za KPÚ Košice : .....

.....

vlastník, správca: .....

.....

ostatní prítomní:

.....

.....

Predmet rokovania, zá very:

KPÚ urobil obhliadku stavby. Aktuálne sú realizované vonkajšie plochy západnej fasády, sever je začatí.

a) - bodové chemické ošetrenie na vzdialenie pôvodnej omietky

b) - sanačný program soklovej časti

c) - vyspravenie odpadnutých častí jadrovej omietky

d) - finálna úprava stierkou - pamiatkársky program

1. KPÚ odporúča realizovať ostrejšie hrany nárožia pilierov
2. plochy sadrokartónových výplní za hornou plochou svetlíka okien natrieť sivou farbou.

Denné záznamy stavby: List č. 02978

Dátum

Anglická ambulancia Lúče - ASO"

DÁTUM
POČASIE
TEPLOTA:
PRACOVNÁ SILA:
PRÁCE PRACOVNÍKOV:
STAVEBNÉ MECHANIZMY:
MATERIÁL:

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

19. 11. 2021
PIATOK

Denné záznamy stavby: List č. 029765

Dátum

„Nový most Bzenec – Přívoz"

1. Výstavba přístupové cesty ze silnice
2. Výstavba mostu - mostní objekt
3. Montáž ocelové konstrukce

Ocelové části
Betonáž: základy
Armokoše: 1-16, 17-18
Práce prováděny tyto firmy: MO-N, VES-3, EMOS-1
Technický dozor z ÚRC
Použité: (skladby) stavební hmoty
Mistrovské opravy: hutěpe.
Ocelové, jiné materiály
Jeřábnictví osobních
Jeřáb přístav.
3) Usazování hlavních nosných částí mostu
4) Usazování mostních
Dílců - ocelových částí
5) Montáž příl. zeď - mat.
6) Montáž příst. [illegible] ocelové části
7) Zbytek montážních prací.

Poznámky:

Denné záznamy stavby:

List č. * 016000

Dátum

„DUGELS MĚLKÁ LOŽA - ETAPA"

16.1.2022

ZAHÁJENÍ GDS: NA ZÁKLADĚ ZÁPISU O SPD ZE DNE 20.11.2022 Č.J. KUJ 20 DNÍ OD 15.01.2022 BOD C. 10.7. GDS OZNAMUJE INVESTOROVI POČÁTEK ZHOTOVOVACÍCH INJEKTÁŽÍ POMOCNÝCH (SONDÁŽNÍCH) DÍLČÍ DÉLKY FASÁDY.
ZHOTOVOVACÍ FASÁDY: 1250 M²
VŠECHNY FIRMY BUDOU SEZNÁMENY, ZE..

17.1.2022
ÚTERÝ

POČASÍ: OBLAČNO
TEPLOTA: +3°C
PŘEHLED PRACOVNÍKŮ: 7+1+1 (VP).
POČTY PRACOVNÍKŮ: VP- 2. VP- CH. STAVEBNÍK- 2.
STROJNÍ TECHNIKA: UNC. BAGER 2,1 t. NÁK. DOSW 500
PROVEDENÍ: 1) DOKONČENÍ DÍLČÍ ZÁVĚRNÉ FASÁDY 1500/600
2) TĚSNĚNÍ NA DOKONČENÍ DÍLČÍ FASÁDY ZÁVĚR.
3) ODSTRANĚNÍ ŠKÁRP SONDÁŽNÍ ETAPOVÉ DO HL. ZDIVA - PŘÍPRAVA PRO ZDĚNÍ.
4) ZAMĚŘENÍ A VYZNAČENÍ PŘESNÉHO TVARU A MATERIÁLU.
5) ZAMĚŘENÍ PŘEKRYTÍ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.15 Stabilizácia omietok	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	25.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	33 963,79
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 963,79
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	33 963,79
24	DPH 20,00 % z 33 963,79	6 792,76
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**40 756,55**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.15 Stabilizácia omietok

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 169
Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**HSV**				**33 963,79**
	100	**Viac práce č. 17**				**33 963,79**
1	100-1	Stabilizácia vonkajšich omietok injektážou	m2	1 257,918	27,00	33 963,79
		Cena 12eur montáž				
		15 eur materiál				
		východ				
		543,4		543,400		
		západ				
		485		485,000		
		sever				
		229,518		229,518		
		juh				
		Súčet		1 257,918		
		Celkom				**33 963,79**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 14 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:04.05.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ___ Fax: ___ Hand: ____

Predmet zmeny: ***Zámena opravy stropov vstupu za sadrokarton***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na návrh dodávateľa boli spracované práce na úpravu vstupu stropov sadrokartonovými podhľadmi nakoľko podľa projekčného riešenia oprava stropov omietok bola kvalitatívne neporovnateľná. .Odsúhlasené projektantom po zistení skutočného stavu.

Oznámil: Dátum: **04.05.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:14**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:	**04.05.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier: ____*	*Fax: _____*	*Hand: _____*		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.14
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***7 609,49*** **€ bez DPH**

Pripravil :
OTÚ **Betpres**
Dátum **04.05.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**
Navrhovaná zmena č.14: ***7 609,49*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 205 609,49 € bez DPH**

Schválil: **Ceving**
Dátum:
Date:

Popis úlohy č.1.16
Po predložení vzoriek rámových dverí, resp. kaziet dverí, GP určí ich farebný odtieň a oznámi ich GDS.

Zodpovedný: **GP**
Termín realizácie: **07.09.2022**

Popis úlohy č. 2.16
Po predložení vzoriek PVC podlahoviny na tribúny, GP určí druh, odtieň a oznámi ich GDS.

Zodpovedný: **GP**
Termín realizácie: **07.09.2022**

Popis úlohy č. 3.16
GDS do 09.09.2022 predloží TDI sumár ZK k dodatku č.2, 12.09.2022 stretnutie za účasti TDI a OTU Betpres s.r.o. - vzájomné odsúhlasenie ZK k dodatku č.2 a podpísanie zmenových konaní.

Zodpovední: **GDS, TDI**
Termín realizácie: **12.09.2022**

Popis úlohy č.4.16
Po dohode zúčastnených GP predloží návrh farebného riešenia stien interiéru objektu, vrátane žľabu ELI po obvodových stenách, ktorý bude výškovo umiestnený podľa návrhu GDS alternatíva č.2. Návrh farebného riešenia sa následne zašle KPU Košice na odsúhlasenie.

Zodpovední: **GP**
Termín realizácie: **05.09.2022**

Popis úlohy č.5.16
Po návrhu DGS GP a Investor súhlasia s realizáciou vnútorných omietok hlavný vstup materiálom – anhydrit, sadrá. Stropy medzi ~~žb prievlakmi budú SDK~~ 12.5mm. GDS predloží menej a viac práce.

Zodpovední: **GDS, TDI**
Termín realizácie: **09.09.2022**

Popis úlohy č.6.16
GDS oznámil investorovi že na základe zápisu zo stretnutia so zástupcami VSD a.s. uskutočneného 25.08.2022 (príloha zápisu č.2)GDS diela oznámi a požiada o prekládku ELI zariadení, VSD následne vygeneruje objednávku a tým začne plynúť lehota min 25dní. GDS upozorňuje Investora, že v lehote od vystavenia objednávky do doby realizácie prekládky je potrebné dojednať podmienky prekládky s p. Redayom , ako vlastníkom susedného objektu. GDS ďalej upozorňuje Investora, že s vlastníkom susedného objektu je nutné jednať podľa platnej PD, podľa ktorej sa realizuje prekládka.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.14 Zámena omietok stropov za sadrokartonové	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	25.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	-1 192,89
2		Montáž	-2 343,37
3	PSV	Dodávky	4 890,68
4		Montáž	6 255,07
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 609,49
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 609,49
24	DPH 20,00 % z 7 609,49	1 521,90
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**9 131,39**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-o	**ZK č.14 Zámena omietok stropov za sadrokartonové**	**7 609,49**	**1 521,90**	**9 131,39**	**0,00**	**7 609,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
o-2	ZK č.14 Zamena omietok stropov za sadrokartonové Cenkros	11 145,75	2 229,15	13 374,90	0.00	11 145,75	0,00	0,00	0,00
o-3	ZK č.14 Zamena omietok stropov za sadrokartonové Menej práce	-3 536,26	-707,25	-4 243,51	0,00	-3 536,26	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**7609,49**	**1521,90**	**9 131,39**	**0,00**	**7 609,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.14 Zámena omietok stropov za sadrokartonové	EČO	
Názov časti	ZK č.14 Zamena omietok stropov za sadrokartonové Cenkros	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	25.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 890,68	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	6 255,07	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 145,75	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	11 145,75
24	DPH 20,00 % z 11 145,75	2 229,15
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**13 374,90**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.14 Zámena omietok stropov za sadrokartonové
Časť: ZK č.14 Zamena omietok stropov za sadrokartonové Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**11 145,75**	**3,767**
763		**Konštrukcie - drevostavby**				**11 145,75**	**3,767**
1	763138210.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	291,700	35,03	10 218,25	3,462
2	763138212	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	25,000	37,10	927,50	0,305
		Celkom				**11 145,75**	**3,767**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.14 Zámena omietok stropov za sadrokartonové	EČO	
Názov časti	ZK č.14 Zamena omietok stropov za sadrokartonové Menej práce	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	25.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	-1 192,89
2		Montáž	-2 343,37
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-3 536,26
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-3 536,26
24	DPH 20,00 % z -3 536,26	-707,25
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-4 243,51**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.14 Zámena omietok stropov za sadrokartonové
Časť: ZK č.14 Zamena omietok stropov za sadrokartonové Menej préce

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1000		**Menej práce**				**-3 536,26**	**-2,145**
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**-3 536,26**	**-2,145**
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**-3 536,26**	**-2,145**
57	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	-235,750	9,50	-2 239,63	-1,167
58	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	-235,750	5,50	-1 296,63	-0,978
		Celkom				**-3 536,26**	**-2,145**

SH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 13 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:02.06.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: _____ *Courier:* ___ *Fax:* ___ *Hand:* _____

Predmet zmeny: ***Otváranie mantinelov,úprava krokiev,kom.páska***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na návrh projektanta boli spracované práce na úpravu záhlavia krokiev .Odsúhlasené projektantom.

2 . Na návrh projektanta boli spracované práce na dodatočnú montáž a dodávku otvaraveho mechanizmu dr.obkladu mantinelov .Odsúhlasené projektantom.

3.Montáž dr.okien mala byť podľa PD na exterierové a interierové pasky , ktoré sa nedali použiť,nakoľko ostenia okien boli pripravené rozmerovo na montáž expanznými paskami.

Po zistení skutočného stavu odsúhlasené projektantom.

Oznámil: Dátum: **02.06.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:13**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:	**02.06.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* _____	*Hand:* _____		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.13
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***8 334,51*** **€ bez DPH**

Pripravil :
BETPRES, OTÚ Betpres
Dátum: 02.06.2022
Date

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:


Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**
Navrhovaná zmena č.13: ***8 334,51*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 206 334,51 € bez DPH**


Schválil: **Cevinç**
Dátum:
Date:

Betpres
25 ROKOV STAVIAME NA HODNOTÁCH

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
e-mail: betpres@betpres.sk, www.betpres.sk, tel.: +421 57 48707 11, fax: +421 57 48707 39

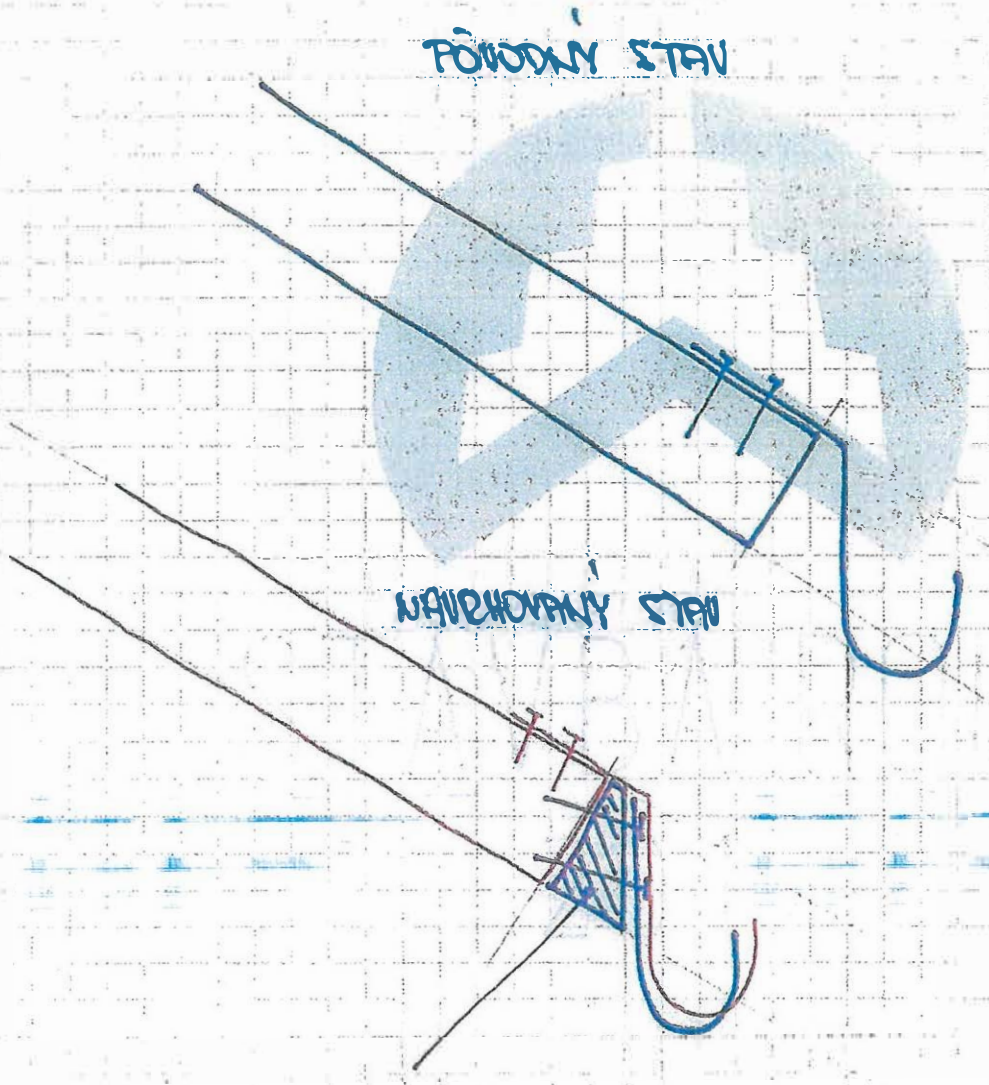

DOPLNENÁ DREVENÁ ČASŤ V ROZNEROCH PÔVODNEJ KROKVY, TAK ABY NOVÝ HÁK SA DAL UKOTVIŤ NA ČELO KROKVY

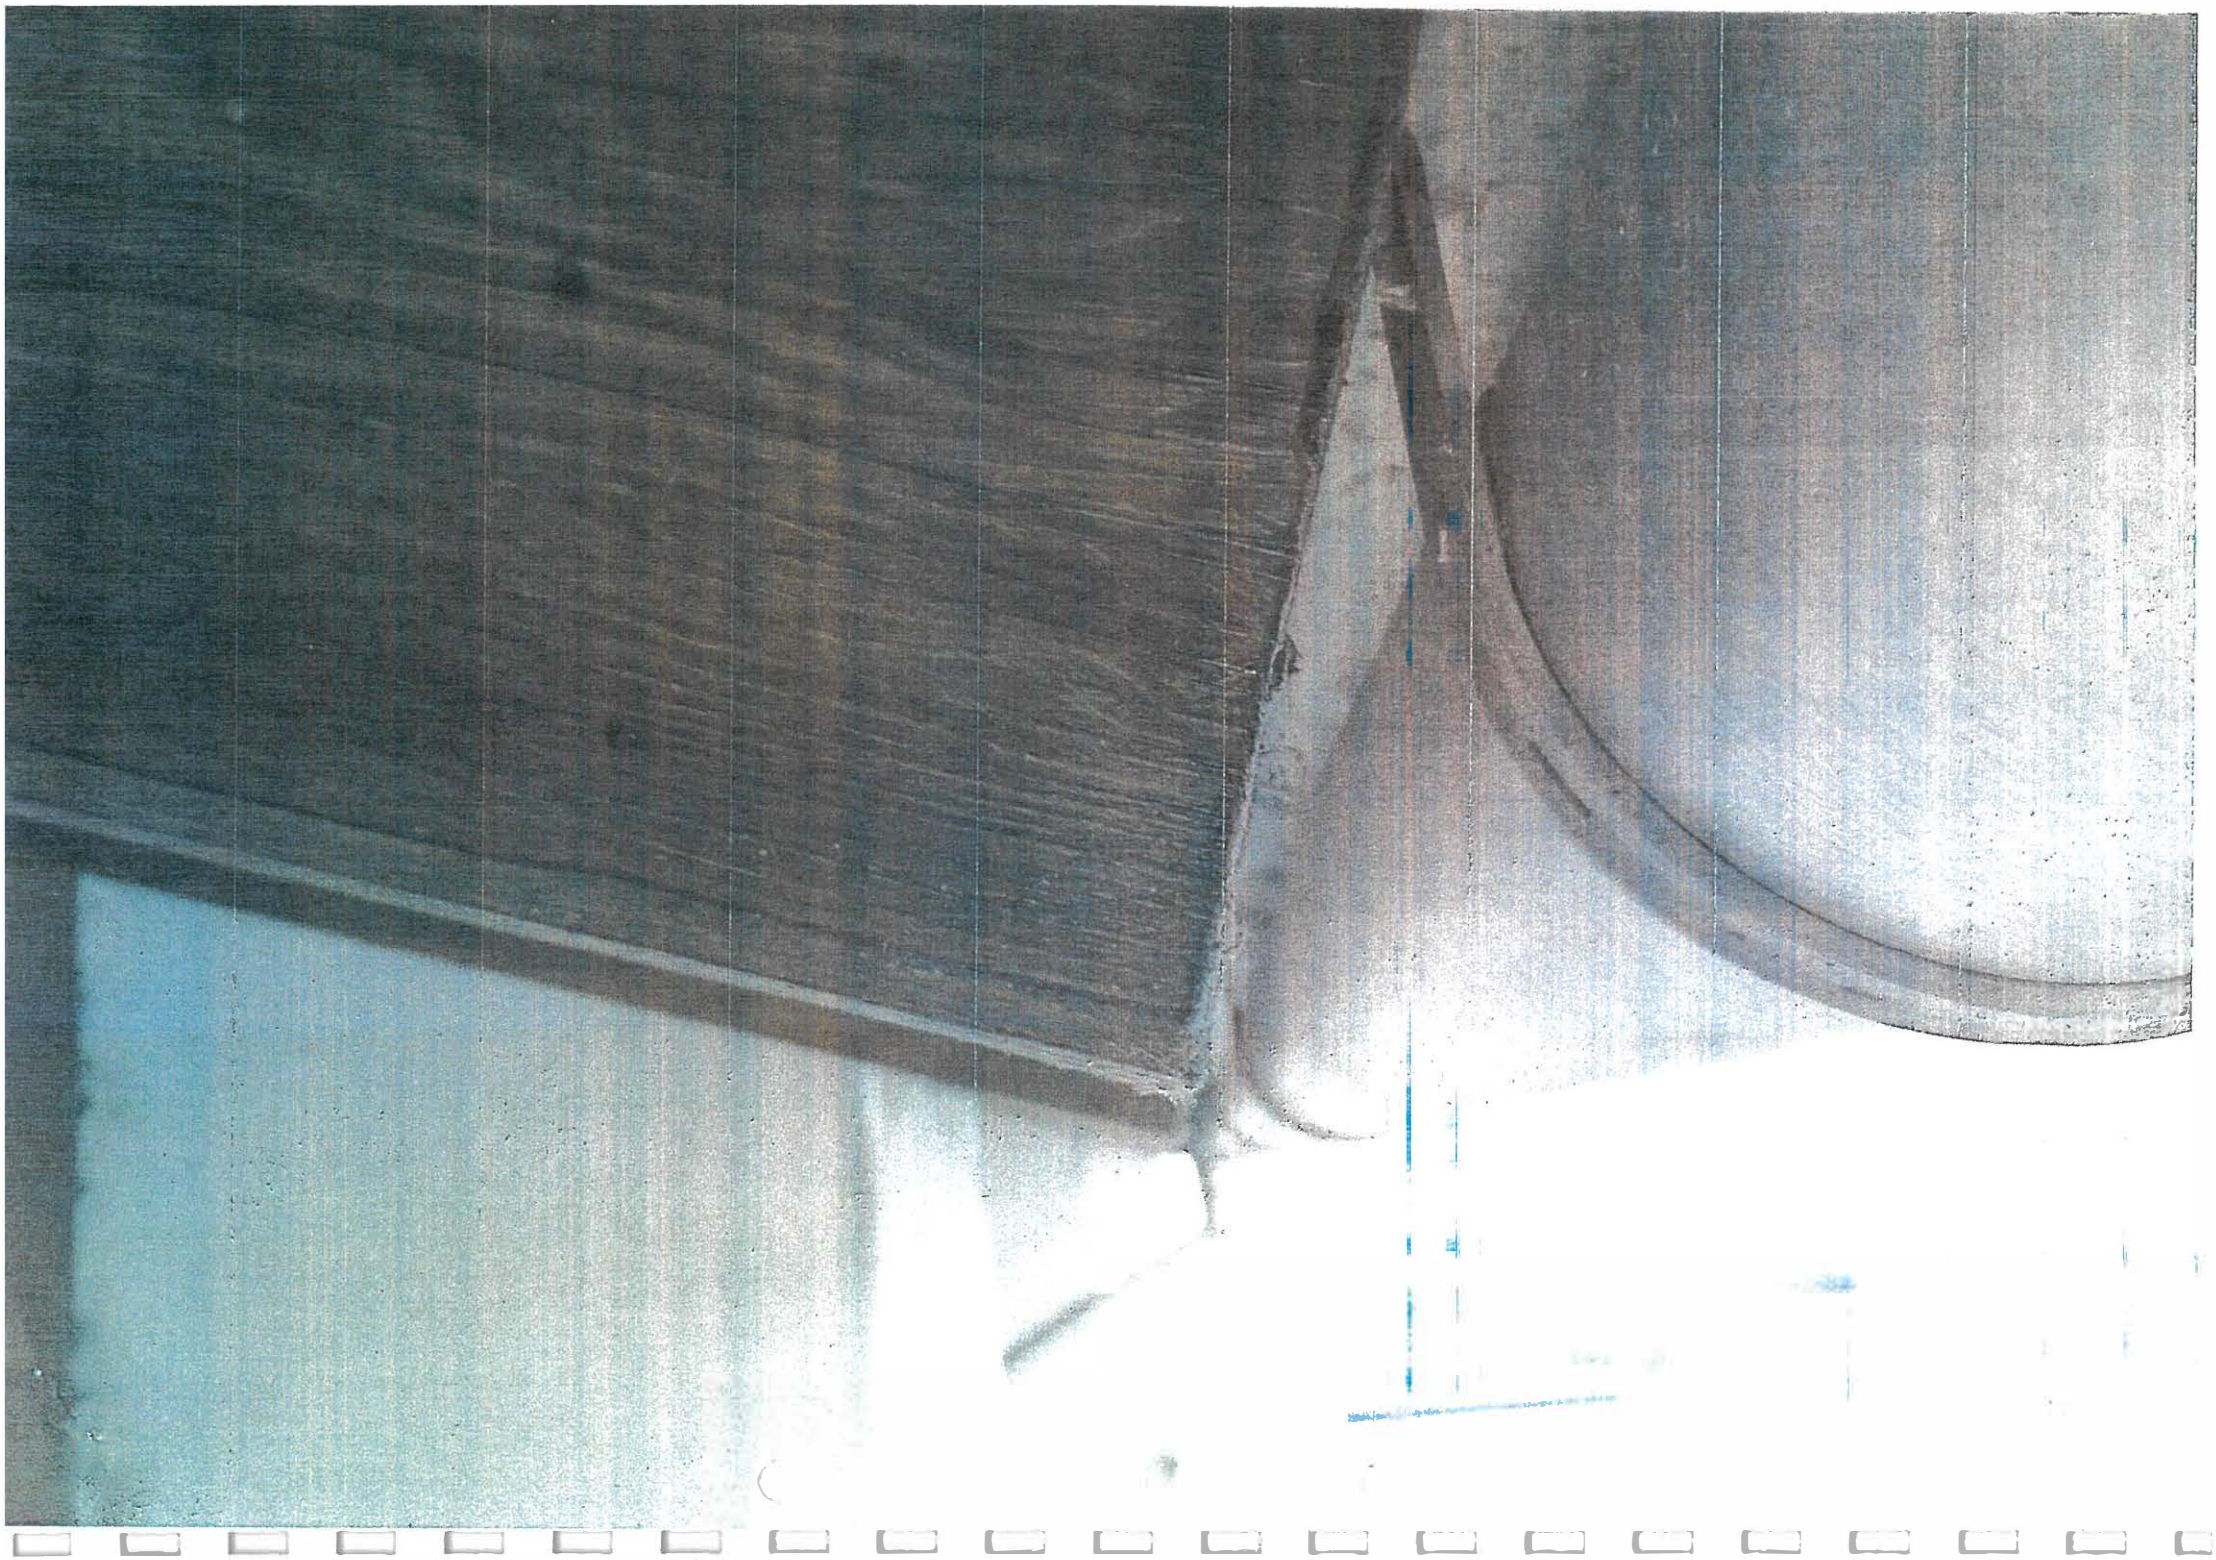

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.13 Otváranie mantinelov,úprava krokiev,kom.páska okien	EČO	
Názov časti	ZK č.13 Otváranie mantinelov,úprava krokiev Cenkros	Miesto	Košice
		IČO	IČDPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	25.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	5 553,99
4		Montáž	2 780,52
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 334,51
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 334,51
24	DPH 20,00 % z 8 334,51	1 666,90
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 001,41**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.13 Otváranie mantinelov,úprava krokiev,kom.páska okien
Časť: ZK č.13 Otváranie mantinelov,úprava krokiev Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 25. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**8 334,51**	**1,044**
	762	**Konštrukcie tesárske**				**1 226,88**	**1,028**
1	762322912.S pc	Vyrovnávajuce klinky na trámy,brúsené,ošetrené impreg.náterom proti škodcom a hnilobe	ks	142,000	6,21	881,82	1,020
2	764251966.S pc	Uprava hákov	ks	142,000	2,43	345,06	0,009
	766	**Konštrukcie stolárske**				**7 107,63**	**0,016**
3	*283550011300.S*	*Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštiukcie*	*m*	*497,000*	*10,17*	*5 054,49*	*0,099*
4	*283290006700.S*	*Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie přípájacej škáry okenného rámu a muriva*	*m*	*-1 044,792*	*1,72*	*-1 797,04*	*-0,104*
5	766669112.S pc	Dorobenie dvier do obkladu v mistach kde budú otváravé dvere,zrazené hrany,impregnácia 2x olejom,podkonštrukcia z hranolov v miestach kde budú dvere,	m2	86,740	25,00	2 168,50	0,000
6	*549320000300*	*Záves dverový pre drevené dvere 14 otvorov po 3 závesy 1,48*2,07 x 2 strany*	*ks*	*42,000*	*40,04*	*1 681,68*	*0,021*
		Celkom				**8 334,51**	**1,044**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN
CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 11
NOTICE NO.

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:20.06.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: ____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Zamena hydroizolácie spodnej stavby***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref.:*

POPIS ZMENY:

1 . Na návrh dodávateľa bola schválena zmena hydroizolácia spodnej stavby z natavovanej lepenky na foliu 1,0 mm 2x chánenou geotextiliou z dôvodu lepších technickýchvlastnosti a dlhšej živitnosti.

Oznámil: Dátum: **20.06.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:11**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:**20.06.2022**	
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* ____	*Hand:* ____		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.11
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***-373,94*** **€ bez DPH**

Pripravil :
OTÚ Betpres
Dátum **20.06.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela:	**2 198 000,00**	**€ bez DPH**
Navrhovaná zmena č.11:	***-373,94***	**€ bez DPH**
Doporučená cena diela :	**2 197 626,06**	**€ bez DPH**

Schválil: **Ceving**
generálny projektant
Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.11 Zámena hydroizolácie spodnej stavby	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	07.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 87,52	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž -461,46	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	-373,94	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	-373,94
24	DPH 20,00 % z -373,94	-74,79
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-448,73**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-I	ZK č.11 Zámena hydroizolácie spodnej stavby	-373,94	-74,79	-448,73	0,00	-373,94	0,00	0,00	0,00
I-1	Zamena hydroizolácie spodnej stavby Cenkros	15 193,86	3 038,77	18 232,63	0,00	15 193,86	0,00	0,00	0,00
I-2	Zamena hydroizolácie spodnej stavby Menej práce	-15 567,80	-3 113,56	-18 681,36	0,00	-15 567,80	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**-373,94**	**-74,79**	**-448,73**	**0,00**	**-373,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.11 Zámena hydroizolácie spodnej stavby	EČO	
Názov časti	Zamena hydroizolácie spodnej stavby Cenkros	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	16.06.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 7 666,41	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 7 527,45	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	15 193,86	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	15 193,86
24	DPH 20,00 % z 15 193,86	3 038,77
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**18 232,63**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.11 Zámena hydroizolácie spodnej stavby
Časť: Zamena hydroizolácie spodnej stavby Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 16. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D2		**PRÁCE A DODÁVKY PSV**				**15 193,86**	**1,941**
711		**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**15 193,86**	**1,941**
1	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	1 013,940	4,21	4 268,69	0,033
2	711491171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	2 027,880	1,94	3 934,09	0,000
6	*283220000200*	*Hydroizolačná fólia PVC-BNK fol 803, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti vlhkosti, tlakovej vode, radónu,farba hnedá, alebo ekvivalent*	*m2*	*1 115,334*	*4,21*	*4 695,56*	*1,461*
		FATRAFOL 803 je hydroizolačná fólia z mPVC pre izoláciu základov proti vlhkosti, radónu, odolná agresívnym spodným vodám, zváča hnedej farby, zvára sa horúcim vzduchom					
7	*693110001100*	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA alebo ekvivalent*	*m2*	*2 230,668*	*0,85*	*1 896,07*	*0,446*
8	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	147,944	2,70	399,45	0,000
		Celkom				**15 193,86**	**1,941**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.11 Zámena hydroizolácie spodnej stavby	EČO	
Názov časti	Zamena hydroizolácie spodnej stavby Menej práce	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	16.06.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-7 578,89	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	-7 988,91	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-15 567,80	12	DN (r. 8-11)		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	-15 567,80
24	DPH 20,00 % z -15 567,80	-3 113,56
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-18 681,36**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.11 Zámena hydroizolácie spodnej stavby
Časť: Zamena hydroizolácie spodnej stavby Menej práce

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 16. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**-15 567,80**	**-11,893**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**-15 567,80**	**-11,893**
1	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	-1 013,940	0,23	-233,21	0,000
2	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*-0,304*	*1 750,00*	*-532,00*	*-0,304*
3	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	-2 027,880	4,00	-8 111,52	-1,095
4	*628320000100*	*Pás asfaltový oxidovaný nataviteľný S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov,*	*m2*	*-2 332,062*	*2,70*	*-6 296,57*	*-10,494*
5	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	-151,730	2,60	-394,50	0,000
		Celkom				**-15 567,80**	**-11,893**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE*** — **OZNÁMENIE : č. 8** / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:12.07.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: _____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Zmenšenie plochy palubovky***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na návrh projektanta boli spracované práce na zmenšenie plochy palubovky nakoľko nie je potrebná pod oceľovou tribunou.

Oznámil: Dátum: **12.07.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:8**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:**12.07.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*
			Vranov nad Topľou	

Odoslané: Kurier: Fax: Osobne: **mailom**
Sent by: *Courier:* ____ *Fax:* _____ *Hand:* _____

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.8
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď rozpočet
projekt

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***-9 807,56*** **€ bez DPH**

Pripravil :
OTÚ Betpres
Dátum **12.07.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**
Navrhovaná zmena č.8: ***-9 807,56*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 188 192,44 € bez DPH**

Schválil: **Ceving,**
generálny projektant
Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.8 Zmenšenie plochy palubovky	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	21.03.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	-125,20
4		Montáž	-9 682,36
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-9 807,56
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-9 807,56
24	DPH 20,00 % z -9 807,56	-1 961,51
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-11 769,07**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.8 Zmenšenie plochy palubovky

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698
Dátum: 21. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1000		**ZK č.4 Zmemnšenie plochy palubovky**				**-9 807,56**
200		**Menej práce**				**-9 807,56**
775		**Podlahy vlysové a parketové**				**-9 807,56**
1	775530040.-R	Dodávka a montáž podlahy hracej plochy v parametroch podľa STN EN 14904, kategória A4, skladba podlahy podľa výrobcu a dodávateľa, hrúbka 150 mm.	m2	-125,200	74,42	-9 317,38
		-1115,2+990		-125,200		
2	775591910.S	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné	m2	-125,200	3,91	-489,53
3	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	-0,023	28,07	-0,65
		Celkom				**-9 807,56**

SH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 6 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o.** **Dátum:09.05.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ *Courier:* ____ *Fax:* ___ *Hand:* _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Spevnené plochy okolo objektu***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na návrh projektanta boli spracované práce na elimináciu navlhovania základového muriva odkopaním objektu a odizolovaním nopovou foliou ako aj štrkovou drenážou.

2.Na návrh projektanta bol upravený vstup do budovy zo severnej strany.

Prace boli naprojektované na návrh projektanta na základe skutočnosti a výškoého zamerania.

Oznámil: Dátum: **09.05.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:6**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:	**09.05.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* _____	*Hand:* _____		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.6
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď rozpočet
projekt

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***34 701,00*** **€ bez DPH**

Pripravil:
OTÚ Betpres
Dátum: **09.05.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**
Navrhovaná zmena č.6: ***34 700,71*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 232 700,71 € bez DPH**

Schválil: **Ceving**
generálny projektant
Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.6 Spevnené plochy okolo objektu	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	18.03.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	9 641,89	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	24 664,42	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	394,40	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		34 700,71	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	34 700,71
24	DPH 20,00 % z 34 700,71	6 940,14
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**41 640,85**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-f	**ZK č.6 Spevnené plochy okolo objektu**	**34 700,71**	**6 940,14**	**41 640,85**	**0,00**	**34 700,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
f-1	Spevnené plochy okolo objektu Cenkros	34 700,71	6 940,14	41 640,85	0,00	34 700,71	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**34700,71**	**6940,14**	**41 640,85**	**0,00**	**34 700,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.6 Spevnené plochy okolo objektu
Časť: Spevnené plochy okolo objektu Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 9. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**33 196,69**	**396,023**
1		**Zemné práce**				**17 700,93**	**347,855**
1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	242,000	22,65	5 481,30	0,000
2	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	242,000	6,80	1 645,60	0,000
3	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	172,800	17,81	3 077,57	0,000
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	172,800	9,43	1 629,50	0,000
5	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	172,800	0,77	133,06	0,000
6	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	184,050	3,56	655,22	0,000
7	*583310002000.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm*	*t*	*347,855*	*14,60*	*5 078,68*	*347,855*
5		**Komunikácie**				**1 875,77**	**35,937**
8	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm betonlôžko pod nopovu foliu klin	m2	53,050	17,63	935,27	17,820
9	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácii pre peších hr. 100mm	m2	75,000	12,54	940,50	18,117
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**9 659,99**	**12,231**
10	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	28,000	14,17	396,76	4,573
11	*592170006700.S*	*Palisáda betónová, rozmer 115x115x400 mm, prírodná*	*ks*	*171,360*	*3,29*	*563,77*	*1,868*
		Spotreba 2 ks/bm					
12	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7.5 kg/m2	t	0,563	1 774,65	999,13	0,578
13	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	166,000	8,88	1 474,08	0,000
14	935111112.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	14,000	11,88	168,32	3,425
15	*592270001900*	*Žľabovka plytká PREMAC, lxšxv 500x200x80(55) mm*	*ks*	*113,120*	*5,23*	*591,62*	*1,787*
		Spotreba 2 ks/bm					
16	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	m2	192,000	9,62	1 847,04	0,000
17	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	102,500	10,20	1 045,50	0,000
18	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 025,000	0,35	358,75	0,000
19	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	102,500	6,86	703,15	0,000
20	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	102,500	3,68	377,20	0,000
21	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	58,700	8,00	469,60	0,000
22	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	43,800	15,23	667,07	0,000
99		**Presun hmôt HSV**				**3 960,00**	**0,000**
23	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	396,000	10,00	3 960,00	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**1 504,02**	**0,119**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**1 504,02**	**0,119**
24	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	208,000	3,40	707,20	0,016
25	*283230000900*	*Profilovaná fólia z PE DELTA-NB, rozmer 20x1 m, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu, DORKEN*	*m2*	*228,800*	*1,64*	*375,23*	*0,103*
		Profilovaná fólia na ochranu základového muriva namiesto izolačnej primurovky, na plošnú drenáž, na výstavbu protiradónových bariér, na odvetranie vlhkosti. Bez zmäkčovadiel. Úplne recyklovateľná. Pevnosť v tlaku: 200 kN/m2.					
26	*283410017100.P*	*Krycia lišta dĺ. 2 m na kotvenie nopovej fólie*	*ks*	*80,000*	*4,93*	*394,40*	*0,000*
27	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,070	2,70	27,19	0,000
		Celkom				**34 700,71**	**396,142**

SH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 5 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:08.09.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Nová skladba podlahy pod palubovkou a tribunami***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref.:*

POPIS ZMENY:

Nova skladba podlahy bola vyvolaná a navrhnutá projektantom na základe zmenených základových pomerov pod východnou a západnou tribunou.

Prace boli zrealizované podľa navrhnutej zmeny na základe výškového zameraniaskutočného stavu.

viď.doplnená PD

Oznámil: Dátum: **08.09.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.: 5**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:	**08.09.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier: ___*	*Fax: _____*	*Hand: _____*		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č. 5
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

vid' : rozpočet
projekt

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***38 927,00*** **€ bez DPH**

Pripravil :
OTÚ Betpres
Dátum **08.09.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela:	**2 198 000,00**	**€ bez DPH**
Navrhovaná zmena č.4:	***38 927,00***	**€ bez DPH**
Doporučená cena diela :	**2 236 927,00**	**€ bez DPH**

Schválil: **Ceving**
generálny projektant
Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.5 Nová skladba podlahy pod palubovkou a tribúnami	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	28.03.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	7 872,36	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	-2 969,10	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	25 484,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	8 539,82	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		38 927,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	38 927,08
24	DPH 20,00 % z 38 927,08	7 785,42
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**46 712,50**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-e-alt	**ZK č.5 Nová skladba podlahy pod palubovkou a tribúnami**	**38 927,08**	**7 785,42**	**46 712,50**	**0,00**	**38 927,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
e-1 alt	ZK č.5 Nová skladba podlahy ZoD	15 661,04	3 132,21	18 793,25	0,00	15 661,04	0,00	0,00	0,00
e-2 alt	ZK č.5 Nová skladba podlahy Cenkros	48 081,54	9 616,31	57 697,85	0.00	48 081,54	0,00	0,00	0,00
e-3alt	ZK č.5 Nová skladba podlahy Menej práce	-24 815,50	-4 963,10	-29 778,60	0,00	-24 815,50	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**38927,08**	**7785,42**	**46 712,50**	**0,00**	**38 927,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.5 Nová skladba podlahy pod palubovkou a tribúnami	EČO	
Názov časti	ZK č.5 Nová skladba podlahy ZoD	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 185,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 321,43	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	7 154,61	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 661,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	15 661,04
24	DPH 20,00 % z 15 661,04	3 132,21
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**18 793,25**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.5 Nová skladba podlahy pod palubovkou a tribúnami
Časť: ZK č.5 Nová skladba podlahy ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 169
Dátum: 6. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	100	**ZK č.5 podľa ZoD**				**15 661,04**
	1000	**Viac prác**				**15 661,04**
	99	**Presun hmôt HSV**				**3 185,00**
1	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	318,500	10,00	3 185,00
		69,5+249		318,500		
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**9 396,75**
11	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	606,700	4,05	2 457,14
12	711491171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	1 213,400	1,94	2 354,00
		606,7*2		1 213,400		
13	*283220000200*	*Hydroizolačná fólia PVC-BNK fol 803, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti vlhkosti, tlakovej vode, radónu,farba hnedá, alebo ekvivalent*	*m2*	*734,107*	*4,21*	*3 090,59*
		FATRAFOL 803 je hydroizolačná fólia z mPVC pre izoláciu základov proti vlhkosti, radónu, odolná agresívnym spodným vodám, zväčša				
		606,7*1,1		667,370		
14	*693110001100*	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MVA alebo ekvivalent*	*m2*	*1 468,214*	*0,85*	*1 247,98*
		606,7*1,1*2		1 334,740		
15	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	91,497	2,70	247,04
	713	**Izolácie tepelné**				**3 079,29**
7	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	606,700	0,30	182,01
8	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia hr. 0,12 mm,*	*m2*	*667,370*	*0,50*	*333,69*
		606,7*1,1		667,370		
9	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1 430,700	1,49	2 131,74
		48,5*3*2		291,000		
		6,5*1,9*2		24,700		
		1115		1 115,000		
		Súčet		1 430,700		
10	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	319,900	1,35	431,85
		Celkom				**15 661,04**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.5 Nová skladba podlahy pod palubovkou a tribúnami	EČO	
Názov časti	ZK č.5 Nová skladba podlahy Cenkros	Miesto	Košice
		IČO	IČDPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	17 316,62
2		Montáž	9 217,14
3	PSV	Dodávky	20 162,57
4		Montáž	1 385,21
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		48 081,54
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	48 081,54
24	DPH 20,00 % z 48 081,54	9 616,31
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**57 697,85**

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.5 Nová skladba podlahy pod palubovkou a tribúnami
Časť: ZK č.5 Nová skladba podlahy Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 169
Dátum: 6. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
100		**ZK č.5 podľa Cenkros**				**48 081,54**
1000		**Viac prác**				**48 081,54**
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**26 533,76**
6	631322661.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	79,200	183,88	14 563,30
		990*0,08		79,200		
1	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	364,200	25,09	9 137,78
		48,5*3,5*2		339,500		
		6,5*1,9*2		24,700		
		Súčet		364,200		
2	632452222.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm	m2	24,700	31,17	769,90
		6,5*1,9*2		24,700		
		Súčet		24,700		
3	632481112.S	Vložka z rabicového pletiva do cementového poteru alebo mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	m2	606,700	3,40	2 062,78
713		**Izolácie tepelné**				**16 707,64**
4	*283750001900.S*	*Doska XPS hr. 60 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*328,454*	*10,00*	*3 284,54*
		48,5*3*2*1,02		296,820		
		6,5*1,9*2*1,02		25,194		
		Súčet		322,014		
5	*283750002000.S*	*Doska XPS hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*1 032,546*	*13,00*	*13 423,10*
		1115*1,02		1 137,300		
		-125		-125,000		
		Súčet		1 012,300		
1000		**Podlaha pod tribunami**				**4 840,14**
7	762512245.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	112,280	7,57	849,96
		(33,39+9,11-2,4)*1,4*2		112,280		
8	*607260000400.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*131,450*	*18,92*	*2 487,03*
		121,712737127371 * 1,08		131,450		
9	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	240,000	2,23	535,20
		40*3*2		240,000		
10	*605110000100.S*	*Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 13-15 mm, š. 60-130 mm*	*m3*	*2,592*	*369,18*	*956,91*
		40*3*2*0,2*0,05		2,400		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**
Objekt: **ZK č.5 Nová skladba podlahy pod palubovkou a tribúnami**
Časť: **ZK č.5 Nová skladba podlahy Cenkros**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 169
Dátum: 6. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	2,592	4,26	11,04

Celkom **48 081,54**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.5 Nová skladba podlahy pod palubovkou a tribúnami	EČO	
Názov časti	ZK č.5 Nová skladba podlahy Menej práce	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	-9 444,26
2		Montáž	-15 371,24
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-24 815,50
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-24 815,50
24	DPH 20,00 % z -24 815,50	-4 963,10
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-29 778,60**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.5 Nová skladba podlahy pod palubovkou a tribúnami
Časť: ZK č.5 Nová skladba podlahy Menej práce

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 169
Dátum: 6. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	2000	**Menej práce**				**-24 815,50**
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**-24 815,50**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**-24 295,50**
3	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	-1 151,060	7,76	-8 932,23
4	632450409	Cementový poter - vyrovnavajuca vrstva , hr. 50 mm	m2	-1 115,200	9,00	-10 036,80
1	632451441.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 50 mm	m2	-591,830	9,00	-5 326,47
	99	**Presun hmôt HSV**				**-520,00**
2	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-52,000	10,00	-520,00
		Celkom				**-24 815,50**

SH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE*** — **OZNÁMENIE : č. 4** / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:25.04.2022**
To: ***st.dozor*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: ____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Základy pod prístavbou***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

Doplnená PD,,Zmena stavby pred dokončením".

Vybúranie jestvujúcej prímurovky okolo základov budovy : 14,08 x 1 x 0,25 =3,7 m3 – Betpres
Osekanie celej omietky na tehlovej stene– 14,08 x 2,5 m – Betpres
Odvoz sute

Navŕtanie a uloženie výstuže(prútov) Ø 14 - 94,5 bm
KY sieťe Ø8, 150x150 : 6 ks - Betpres

Realizácia jednostranného debnenia 35,2 m2 -
Betonáž ŽB steny: 12,32 m3
Demontáž jednostranného debnenia: 35,2 m2 -

Nový výkaz výmer z nových základov pod prístavbu :

Debnenie :	60,05 m2
Betón základov :	45,7 m3
DT tvárnice 300 mm:	3,5 m3
Betón do DT :	2,18 m3
Výstuž do DT R10mm:	90 b.m

Vo výkaze ešte chýba základ, ktorý má projektant doplniť

Oznámil: *Issued by:* Dátum: **25.04.2022** *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

SH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.: 4**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:		Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:	**25.04.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*	
			Vranov nad Topľou		
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**		
Sent by:	*Courier: ____*	*Fax: ____*	*Hand: ____*		

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č. 4
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***31 109,90*** **€ bez DPH**

Pripravil :
OTÚ Betpres
Dátum **25.04.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:
stavebný dozor
Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**
Navrhovaná zmena č.4: ***31 109,90*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 229 109,90 € bez DPH**

Schválil: **Ceving,**
generálny projektant
Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.4 Základy pod prístavbou	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	24.03.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	14 020,41
2		Montáž	17 089,49
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		31 109,90
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	31 109,90
24	DPH 20,00 % z 31 109,90	6 221,98
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**37 331,88**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-d	**ZK č.4 Základy pod prístavbou**	**31 109,90**	**6 221,98**	**37 331,88**	**0,00**	**31 109,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
d-1	ZK č.4 Zaklady pod prístavbou ZoD	8 721,97	1 744,39	10 466,36	0,00	8 721,97	0,00	0,00	0,00
d-2	ZK č.4 Zaklady pod prístavbou Cenkros	26 377,59	5 275,52	31 653,11	0,00	26 377,59	0,00	0,00	0,00
d-3	ZK č.4 Zaklady pod prístavbou -menej práce	-3 989,66	-797,93	-4 787,59	0,00	-3 989,66	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**31109,90**	**6221,98**	**37 331,88**	**0,00**	**31 109,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.4 Základy pod prístavbou	EČO	
Názov časti	ZK č.4 Zaklady pod prístavbou ZoD	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	31.03.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	1 523,58
2		Montáž	7 198,39
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 721,97
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 721,97
24	DPH 20,00 % z 8 721,97	1 744,39
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 466,36**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.4 Základy pod prístavbou
Časť: ZK č.4 Zaklady pod prístavbou ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 31. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	100	**ZK č.4**				**8 721,97**	**39,182**
	1000	**Viac práce**				**8 721,97**	**39,182**
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**8 721,97**	**39,182**
	1	**Zemné práce**				**4 990,54**	**0,000**
1	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 -základy	m3	67,449	45,66	3 079,72	0,000
2	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z hom. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	67,449	8,16	550,38	0,000
4	162201219.S	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	67,449	2,54	171,32	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	67,449	3,41	230,00	0,000
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	67,449	0,62	41,82	0,000
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	114,663	8,00	917,30	0,000
	2	**Zakladanie**				**1 817,29**	**39,182**
10	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	16,102	74,86	1 205,40	38,898
11	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	80,512	7,60	611,89	0,284
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 522,34**	**0,000**
14	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	61,360	3,39	208,01	0,000
15	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	613,600	0,27	165,67	0,000
16	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	61,360	2,19	134,38	0,000
17	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	61,360	3,53	216,60	0,000
18	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	61,360	13,00	797,68	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**391,80**	**0,000**
19	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	39,180	10,00	391,80	0,000
		Celkom				**8 721,97**	**39,182**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.4 Základy pod prístavbou	EČO	
Názov časti	ZK č.4 Zaklady pod prístavbou Cenkros	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	31.03.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	14 299,53	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	12 078,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 377,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	26 377,59
24	DPH 20,00 % z 26 377,59	5 275,52
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**31 653,11**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.4 Základy pod prístavbou
Časť: ZK č.4 Zaklady pod prístavbou Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 31. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
100		**ZK č.3**				**26 377,59**	**293,058**
1000		**Viac práce**				**26 377,59**	**293,058**
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**26 377,59**	**293,058**
1		**Zemné práce**				**2 234,25**	**0,000**
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 hr.200 mm	m3	63,636	12,03	765,54	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	63,636	0,95	60,45	0,000
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,636	3,41	217,00	0,000
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	636,360	0,45	286,36	0,000
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	63,636	0,62	39,45	0,000
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	108,181	8,00	865,45	0,000
2		**Zakladanie**				**14 904,58**	**249,356**
7	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm pod dosku	m3	39,886	58,62	2 338,12	82,564
8	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm,0-125 mm pod pasy	m3	23,298	46,28	1 078,23	48,227
9	273362443.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	72,520	7,98	578,71	0,347
10	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	48,435	107,25	5 194,65	117,005
11	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	152,780	16,38	2 502,54	0,102
12	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	143,580	3,07	440,79	0,000
13	274353004.S	Denný prenájom ručného systémového debnenia základových pásov, pre výšku debniaceho panela 900 mm	m2	143,580	1,10	157,94	0,000
14	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,089	2 400,00	2 613,60	1,110
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**4 746,97**	**43,703**
15	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	12,320	112,56	1 386,74	29,765
16	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	35,200	19,48	685,70	0,118
17	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	35,200	6,38	224,58	0,000
18	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,113	1 984,07	224,20	0,115
19	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,194	2 070,59	401,69	0,233
20	274361821.S-zp	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,235	2 400,00	564,00	0,239
21	312271303	Murivo výplňové (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	6,250	201,61	1 260,06	13,232
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 561,79**	**0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t primurovka a steny I.PP	m3	19,244	26,12	502,65	0,000
23	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t I.PP mazanina	m3	8,051	93,42	752,12	0,000
24	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,440	81,25	198,25	0,000
25	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	35,200	3,09	108,77	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 930,00**	**0,000**
26	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	293,000	10,00	2 930,00	0,000
		Celkom				**26 377,59**	**293,058**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**	JKSO	
Názov objektu	**ZK č.4 Základy pod prístavbou**	EČO	
Názov časti	**ZK č.4 Zaklady pod prístavbou -menej práce**	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	31.03.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	-1 802,70
2		Montáž	-2 186,96
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-3 989,66
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-3 989,66
24	DPH 20,00 % z -3 989,66	-797,93
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-4 787,59**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.4 Základy pod prístavbou
Časť: ZK č.4 Zaklady pod prístavbou -menej práce

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 31. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**-3 989,66**	**-51,916**
	100	**ZK č.4**				**-3 470,50**	**-51,916**
	2000	**Menej práce**				**-3 470,50**	**-51,916**
18	279311115.S	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 20/25	m3	-20,578	128,58	-2 645,92	-45,583
21	311237512	Murivo akustické (m3) z tehál pálených 25 P+D AKA (akustik) P 12, na maltu MVC (250x375x238)	m3	-5,360	153,84	-824,58	-6,333
	99	**Presun hmôt HSV**				**-519,16**	**0,000**
96	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-51,916	10,00	-519,16	0,000
		Celkom				**-3 989,66**	**-51,916**
